AIA MANAGEMENT

Etabli par Ph HALADJIAN

BEZIERS TCE - Phase 1 et 2

Etabli le 29 novembre 2019
Mis a jour le 17 janvier 2020
Mis a jour le 21 février 2020
Mis a jour le 06 mars 2020 - V1
Mis a jour le 22 juin 2020 V1 puis le 29 juin V2

N°	Entreprise	Texl	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achevé
2			**Travaux Phase 1**	**269 jours**	**19/08/19**	**16/10/20**	**70%**
8			**Bât A**	**243 jours**	**16/09/19**	**08/10/20**	**88%**
28			**CES**	**174 jours**	**06/01/20**	**08/10/20**	**85%**
48			**Sanitaires**	**121 jours**	**06/01/20**	**29/06/20**	**94%**
63	Libes	08	Peinture	7 jours	15/06/20	23/06/20	90%
64	Elec Service	12	Appareillage CF-cf	4 jours	19/06/20	25/06/20	90%
65	Thermatic	11	Appareillage Pb	4 jours	19/06/20	24/06/20	100%
66	Carayon	05	Appareillages	3 jours	24/06/20	26/06/20	0%
67	Carayon	05	Miroirs	1 jour	29/06/20	29/06/20	100%
68			**Hall - Billeterie - Restaurant**	**151 jours**	**21/01/20**	**22/09/20**	**81%**
69	Carayon	05	Repose FP bois	5 jours	29/06/20	03/07/20	100%
70	Libes	08	Vernis restaurant	3 jours	06/07/20	08/07/20	100%
86	Friyed	04	FP fibre de bois vers sanitaires	1 jour	29/06/20	29/06/20	100%
87	Carayon	05	Appareillages portes	5 jours	10/06/20	16/06/20	0%
88	Elec Service	12	Appareillage CF-cf	7 jours	30/06/20	08/07/20	90%
89	Thermatic	11	Appareillage Pb et ventillation	7 jours	29/06/20	07/07/20	100%
90	Elec Service	12	Armoire TD et Vdi	5 jours	09/07/20	16/07/20	80%
91	Texen	16	Armoires et appareillages	10 jours	30/06/20	13/07/20	90%
92	Sogea	01	Dépose protection sur chape + nettoyage	1 jour	31/08/20	31/08/20	0%
93	Sogea	01	Réalisation bouche-pore	1 jour	31/08/20	31/08/20	0%
94	Carayon	05	Meuble Bar	5 jours	01/09/20	07/09/20	0%
95	Carayon	05	Banque d'accueil - Billeterie	5 jours	08/09/20	14/09/20	0%
96	Thermasud		Appareillage bar	2 jours	15/09/20	16/09/20	0%
97	Carayon	14	Rideaux occultants	3 jours	17/09/20	21/09/20	0%
98	Reinaudo	10	Paillasson	1 jour	22/09/20	22/09/20	0%
99			**Terrasse du restaurant**	**57 jours**	**16/04/20**	**09/07/20**	**74%**
106	Libes	08	Peinture noire	5 jours	29/06/20	03/07/20	0%
107	Elec Service	12	Appareillage CF-cf	2 jours	06/07/20	07/07/20	50%
108	Texen	16	Appareillage Texen	2 jours	06/07/20	07/07/20	100%
109	Solatrag	01	Grille gratte-pied	2 jours	08/07/20	09/07/20	0%
110			**Escalier A1 - Accès local CTA**	**149 jours**	**06/01/20**	**03/09/20**	**88%**
115	Libes	08	Peinture de propreté (sol et murs)	7 jours	15/06/20	23/06/20	90%
116	Libes	08	Nez de marches, bande podo	2 jours	01/09/20	02/09/20	0%
118			**Sous-station**	**130 jours**	**06/01/20**	**10/07/20**	**95%**
124	Thermatic	11	Aménagement sous-station	20 jours	15/06/20	10/07/20	90%
125			**Local CTA R+1**	**111 jours**	**27/01/20**	**06/07/20**	**97%**
133	Thermatic	11	Aménagement local CTA	20 jours	09/06/20	06/07/20	90%
134			**Phase Finale**	**25 jours**	**04/09/20**	**08/10/20**	**0%**
135	Libes		Ménage pour OPR	3 jours	08/09/20	10/09/20	0%
136	MOEx		OPR Bât A	5 jours	04/09/20	10/09/20	0%
137			Levée des réserves	10 jours	11/09/20	24/09/20	0%
138	MOEx		Contôle MOEx	5 jours	25/09/20	01/10/20	0%
139			Fin de levée des réserves : objectif zéro rés	5 jours	02/10/20	08/10/20	0%
140			**Bât B**	**233 jours**	**04/10/19**	**14/10/20**	**67%**
141			**Clos et Couvert Bât B : salle de spectacle**	**210 jours**	**04/10/19**	**11/09/20**	**88%**
155	Solatrag	07	Porte acier (3U)	5 jours	07/09/20	11/09/20	0%
158	Pyr Charpente	02	Test d'étanchéité à l'air	0 jour	11/09/20	11/09/20	0%
160	Pyr Charpente	02	Solde bardage devant LT	10 jours	31/08/20	11/09/20	0%
163	Solatrag	07	Grilles de façades	5 jours	07/09/20	11/09/20	0%
164			**CES**	**124 jours**	**09/03/20**	**01/10/20**	**60%**
165	Texen	16	CC et distributions toutes zones bât B	5 sm	06/07/20	07/08/20	55%
166			**Arrière scène et locaux périphériques scèn**	**106 jours**	**10/03/20**	**08/09/20**	**91%**
175	Texen	16	Distributions réseaux scénique	10 jours	06/07/20	20/07/20	100%
180	Friyed	04	Faux plafond fibre de bois yc 2 murs salle r	5 jours	15/07/20	21/07/20	80%
187	Chuecos	09	Lino	5 jours	06/07/20	10/07/20	100%
188	Carayon	05	Portes à peindre	2 jours	13/07/20	15/07/20	70%
189	Libes	08	Finitions peinture	10 jours	13/07/20	27/07/20	65%
190	Carayon	05	Appareillages portes	7 jours	28/07/20	01/09/20	0%
191	Elec Service	12	Appareillage cf-cf	5 jours	28/07/20	24/08/20	70%
192	Thermatic	11	Appareillage Pb	5 jours	28/07/20	24/08/20	70%
193	Carayon	05	Miroirs	2 jours	02/09/20	03/09/20	0%
194			**Circualtion zone locaux périphérique scène + aire de service**	**37 jours**	**15/07/20**	**01/10/20**	**25%**
195			Fin circulation nacelle grande salle	0 jour	15/07/20	15/07/20	100%
196	Sogea	01	Béton quartzé yc barrière étanche	3 jours	29/07/20	31/07/20	100%
197	Sogea	01	Séchage	5 jours	17/08/20	21/08/20	100%
198	Sogea	01	Protection	2 jours	07/09/20	08/09/20	0%
199	Libes	08	Peinture	5 jours	24/08/20	03/09/20	0%
200	Carayon	05	Pose des plinthes	2 jours	09/09/20	10/09/20	0%
201	Libes	08	Solde peinture	5 jours	11/09/20	17/09/20	0%
202	Friyed	04	Faux plafond	5 jours	18/09/20	24/09/20	0%
203	Elec Service	12	Appareillage	5 jours	25/09/20	01/10/20	0%
204			**Locaux scéniques**	**16 jours**	**17/08/20**	**18/09/20**	**0%**
205	Texen	16	Aménagement local audio (nord)	10 jours	17/08/20	28/08/20	0%
206	Texen	16	Aménagement local gradateur	15 jours	31/08/20	18/09/20	0%
207			**Escalier B3**	**83 jours**	**20/04/20**	**15/09/20**	**30%**
211	Libes	08	Peinture et anti poussière	7 jours	31/08/20	08/09/20	0%
212	Sogea	01	Anti-poussière	7 jours	31/08/20	08/09/20	0%
213	Solatrag	07	Main courante et GC	2 jours	09/09/20	10/09/20	0%
214	Elec Service	12	Appareillage	1 jour	11/09/20	11/09/20	0%
215	Libes	08	Nez de marches + contraste	2 jours	14/09/20	15/09/20	0%
216			**Zone gradins amovibles + circulations et S**	**90 jours**	**14/04/20**	**18/09/20**	**64%**
220	Thermatic	11	Distributions CVC	8 jours	22/06/20	01/07/20	100%
222	Texen	16	Distributions réseaux scénique	15 jours	06/07/20	27/07/20	20%
224	Carayon	05	Mural en panneau contreplaqué brut	10 jours	08/06/20	19/06/20	100%
225	Libes	08	Vernis sur peinture noire	5 jours	06/07/20	10/07/20	0%
227	Technisol	06	Parquet yc barrière anti-humidité et peintur	20 jours	20/07/20	14/08/20	25%

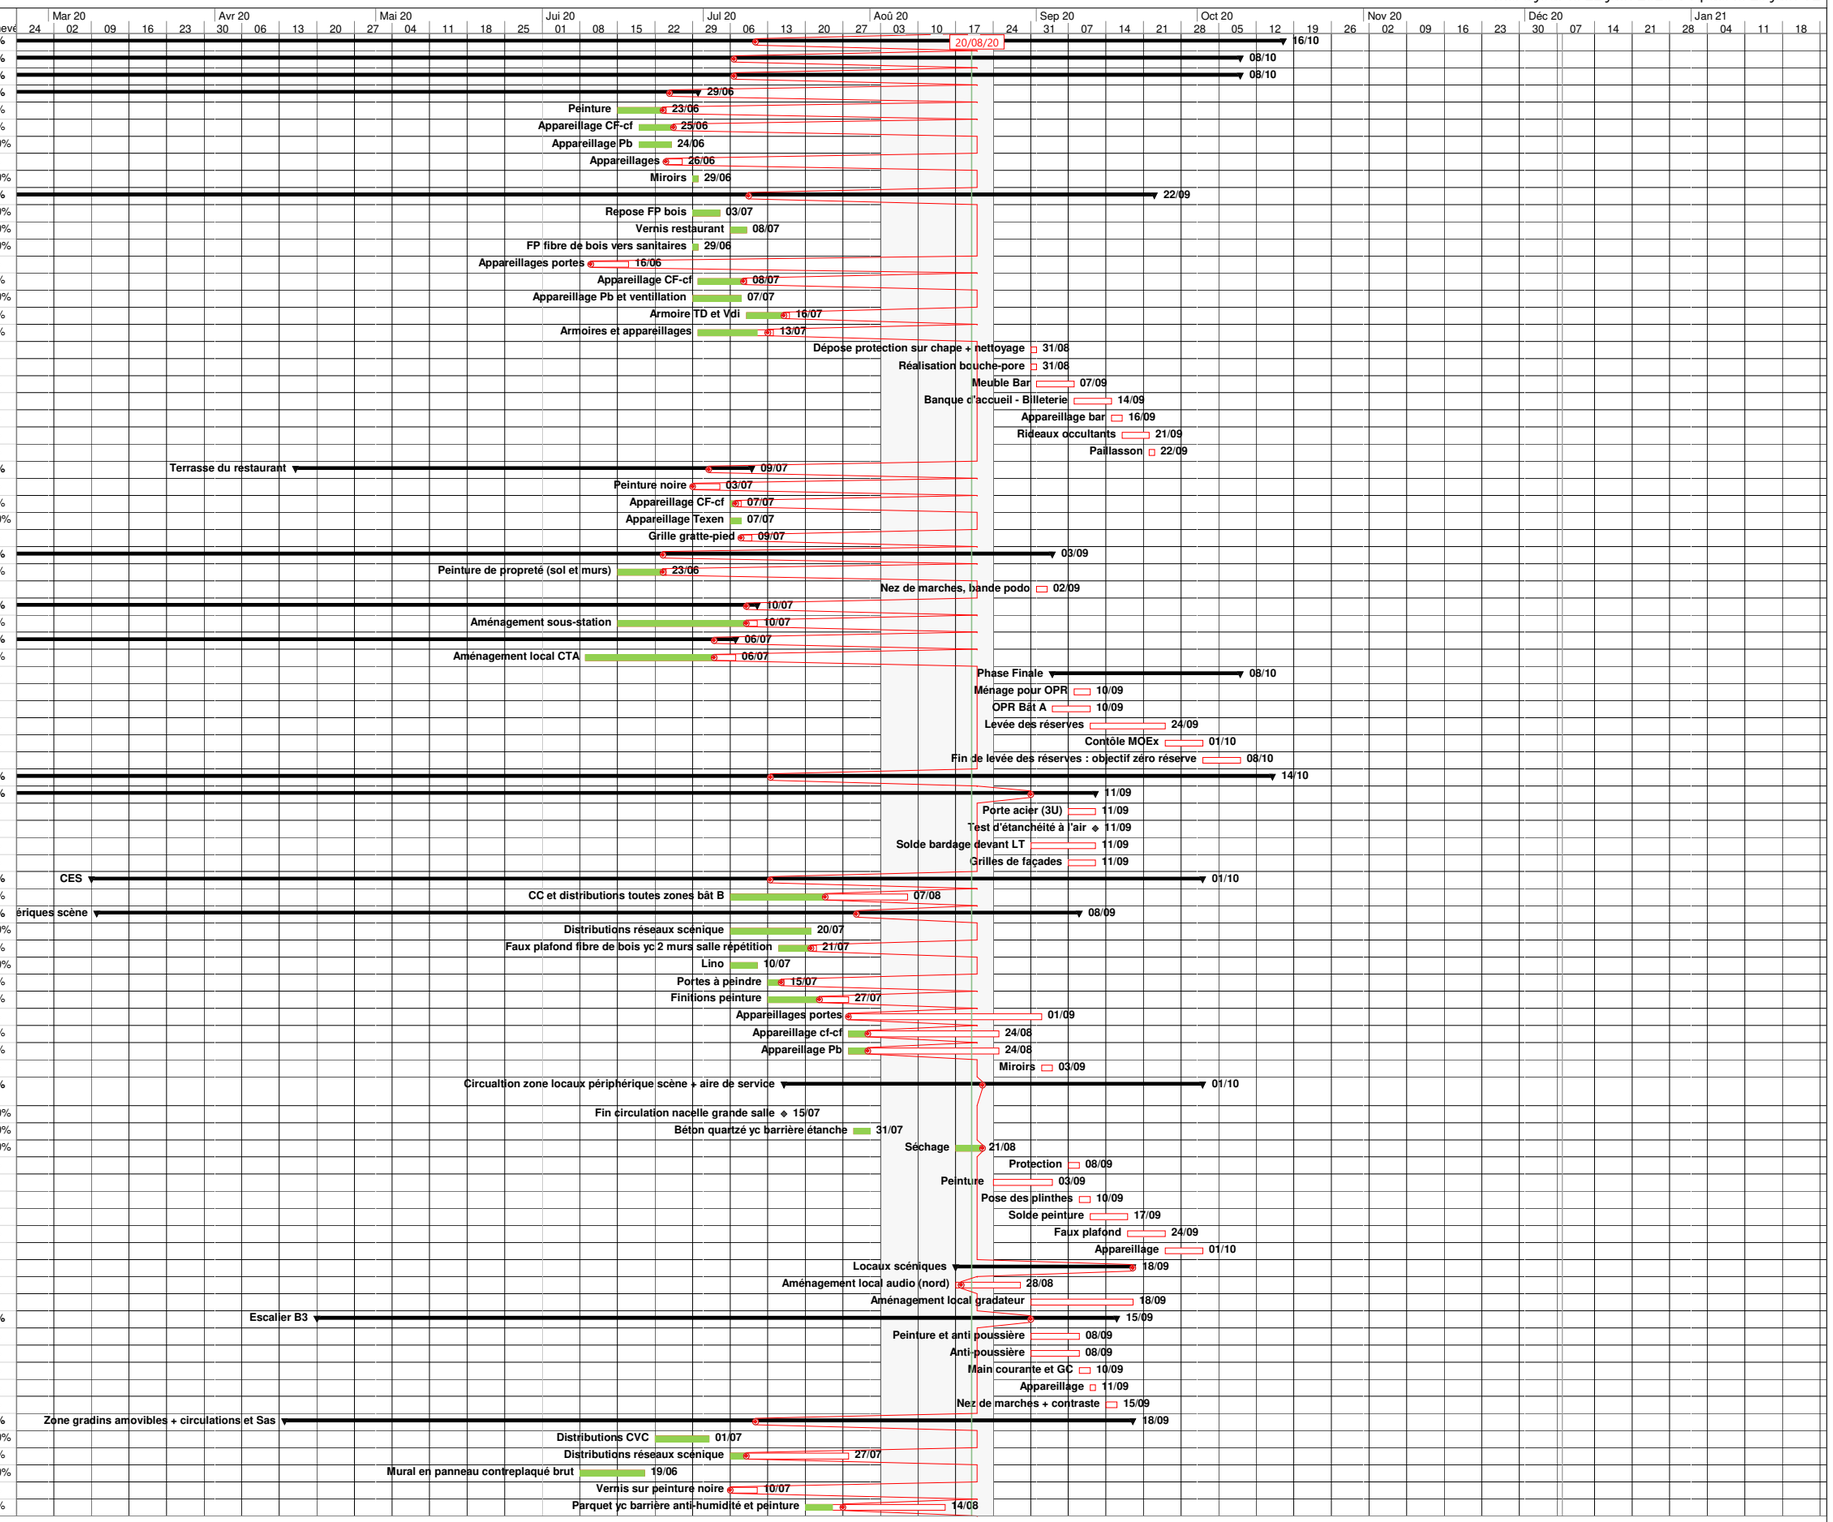

AIA MANAGEMENT

Etabli par Ph HALADJIAN

BEZIERS TCE - Phase 1 et 2

Etabli le 29 novembre 2019
Mis a jour le 17 janvier 2020
Mis a jour le 21 février 2020
Mis a jour le 06 mars 2020 - V1
Mis a jour le 22 juin 2020 V1 puis le 29 juin V2

N°	Entreprise	Texl	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achevé
228	Technisol	06	Protection parquet	2 jours	13/08/20	14/08/20	0%
229	COS	15	Pose des gradins, GC, sièges, numérotatio	15 jours	31/08/20	18/09/20	0%
230	Solatrag	07	Pose GC (sur voile béton) haut des gradins	5 jours	31/08/20	04/09/20	0%
231	Libes	08	SAS : peinture préparation et impression	5 jours	06/07/20	10/07/20	90%
232	Friyed	04	SAS : Faux plafond fibre de bois	2 jours	13/07/20	15/07/20	100%
233	Chuecos	09	SAS : Béton quartzé	2 jours	24/08/20	31/08/20	0%
234			**Zone scène**	**78 jours**	**04/05/20**	**21/09/20**	**68%**
238	Friyed	04	Pose FP acoustique	11 jours	25/05/20	08/06/20	100%
239	Friyed	04	Doublage acoustique fibre de bois (0 à 6.0(	10 jours	15/06/20	26/06/20	100%
241	BC Caire	14	Pose gril et faux gril	20 jours	28/05/20	24/06/20	100%
242	BC Caire	14	Aménagement du pallan de levage yc sécu	4 jours	25/06/20	30/06/20	98%
243	BC Caire	14	Passerelle de scéne R+2	5 jours	25/06/20	01/07/20	100%
244	BC Caire	14	Pose gril et caillebotis	10 jours	24/06/20	07/07/20	100%
245	BC Caire	14	Machinerie scénique yc LT	20 jours	29/06/20	27/07/20	80%
247	Elec Service	12	Distributions CF-cf et pose luminaires	5 jours	08/07/20	15/07/20	100%
248	Texen	16	Distributions réseaux scénique	20 jours	06/07/20	04/08/20	60%
249	Texen	16	Apparaillge depuis équipements BC Caire	10 jours	20/07/20	04/08/20	0%
250			**Plancher scène**	**34 jours**	**09/06/20**	**27/07/20**	**54%**
252	Texen	16	Distibution scénique sous la scène	5 jours	06/07/20	10/07/20	100%
253	Texen	16	Appareillage luminaires yc sous 1ére pa	5 jours	13/07/20	20/07/20	0%
254	BC Caire	14	Plancher de scéne	10 jours	13/07/20	27/07/20	80%
255	BC Caire	14	Plancher ponçage et peinture	5 jours	21/07/20	27/07/20	0%
256	BC Caire	14	Installation scénique	5 sm	04/08/20	07/09/20	0%
257	BC Caire	14	Rideaux, écran…	10 jours	08/09/20	21/09/20	0%
258			**Esacliers B1 et B2 + régie**	**45 jours**	**29/06/20**	**25/09/20**	**43%**
259	Solatrag	07	Escalier B1 (Limons, marches, GC…)	2 sm	29/06/20	10/07/20	50%
260	Solatrag	07	Escalier B2 (Limons, marches, GC…)	2 sm	06/07/20	20/07/20	50%
261	Solatrag	07	Portillons régie et gradins	2 jours	21/07/20	22/07/20	0%
262	Carayon	05	Régie	10 jours	24/08/20	04/09/20	100%
263	Carayon	05	Plancher technique régie	5 jours	31/08/20	04/09/20	0%
264	Carayon	05	Aménagement régie	5 jours	14/09/20	18/09/20	0%
265	Texen	16	Aménagement régie	5 jours	21/09/20	25/09/20	0%
266			**Sas entre A et B**	**57 jours**	**18/05/20**	**03/09/20**	**69%**
267	Carayon	05	Habillage bois et murs	5 jours	15/06/20	19/06/20	100%
269	Technisol	06	Plancher yc finitions	5 jours	24/08/20	03/09/20	20%
271			**Locaux techniques**	**110 jours**	**09/03/20**	**11/09/20**	**49%**
277	Thermatic	11	Rdc - Local Sous-Station	20 jours	11/05/20	09/06/20	80%
278	Elec Service	12	Rdc - Local TGBT	25 jours	29/06/20	24/08/20	0%
279	Elec Service	12	Rdc - Local GTB	15 jours	29/06/20	20/07/20	0%
280	Elec Service	12	Rdc - Local source centrale	10 jours	29/06/20	10/07/20	0%
281	Elec Service	12	Rdc - Local AES	10 jours	31/08/20	11/09/20	0%
282	Elec Service	12	Rdc - Local PC sécurité	20 jours	29/06/20	27/07/20	25%
283			**R+1 - Local CTA1 (depuis passerelle)**	**58 jours**	**18/05/20**	**04/09/20**	**56%**
286	Libes	08	Peinture murs	5 jours	29/06/20	03/07/20	100%
287	Thermatic	11	Aménagement	25 jours	06/07/20	04/09/20	10%
289			**R+1 - Local CTA2 (depuis escalier béton)**	**78 jours**	**22/04/20**	**10/09/20**	**63%**
290	Sogea	01	Etanchéité liquide	6 jours	25/06/20	02/07/20	100%
293	Thermatic	11	Aménagement	30 jours	03/07/20	10/09/20	30%
294			**LT - R+2 - Local désenfumage**	**48 jours**	**11/05/20**	**20/07/20**	**56%**
297	Libes	08	Peinture (sols et murs)	3 jours	08/06/20	10/06/20	100%
298	Thermatic	11	R+2 - Local désenfumage depuis passe	3 sm	29/06/20	20/07/20	30%
299			**LT - R+2 - Local machinerie scénique**	**50 jours**	**04/05/20**	**16/07/20**	**53%**
301	Friyed	04	Cloisons circulations	5 jours	08/06/20	12/06/20	100%
303	Libes	08	Peinture (sols et murs)	3 jours	25/06/20	29/06/20	100%
304	BC Caire	14	R+2 : aménagement local machinerie sc	3 sm	25/06/20	16/07/20	0%
309			**Extérieurs SUD et OUEST**	**118 jours**	**30/03/20**	**14/10/20**	**72%**
315	PSP	18	Fosse d'arbres	5 jours	31/08/20	04/09/20	0%
320	Colas	17	Clotures et portails	10 jours	07/09/20	18/09/20	0%
321	PSP	18	Mobiliers	5 jours	21/09/20	25/09/20	0%
322	PSP	18	Plantations	10 jours	01/10/20	14/10/20	0%
323			**Extérieurs NORD**	**104 jours**	**20/04/20**	**14/10/20**	**78%**
337	Colas	17	Pose pierre 200 m² par semaine	5 sm	15/06/20	20/07/20	95%
338	Colas	17	Cloture	5 jours	21/09/20	25/09/20	0%
339	Colas	17	Pose des candélabres	5 jours	14/09/20	18/09/20	0%
340	PSP	18	Mobiliers	10 jours	28/09/20	09/10/20	0%
341	PSP	18	Plantations	10 jours	01/10/20	14/10/20	0%
342			**Plateforme Extérieure - Bât D**	**120 jours**	**23/03/20**	**09/10/20**	**72%**
348	Elec Service	12	Aménagement transfo privé	20 jours	02/06/20	29/06/20	100%
349	Thermatic	11	Aménagement zone froid - PAC	25 jours	31/08/20	02/10/20	0%
350	Colas	17	Enveloppe gabions	5 jours	05/10/20	09/10/20	0%
351	Elec Service	12	Consuel transfo	15 jours	30/06/20	21/07/20	100%
352	Enedis		Mise sous tension du transfo	2 jours	22/07/20	23/07/20	100%
353			**Phase finale phase 1 - Bât A et B**	**35 jours**	**31/08/20**	**16/10/20**	**0%**
354			**Essais A et B**	**25 jours**	**31/08/20**	**02/10/20**	**0%**
355	Pyr Charpente	02	Test d'étanchéité à l'air	0 jour	04/09/20	04/09/20	0%
356	Elec Service	12	Courant définitif - date au plus tard	0 jour	31/08/20	31/08/20	0%
357	Elec Service	12	Essais CF-cf-Ssi	15 jours	31/08/20	18/09/20	0%
358	Thermatic	11	Essais CVC - Désenfumage	15 jours	31/08/20	18/09/20	0%
359	BC Caire	14	Essais machinerie scénique	15 jours	14/09/20	02/10/20	0%
360	Thermatic	11	Essais froid	10 jours	02/09/20	15/09/20	0%
361			Ménage avant OPR	5 jours	21/09/20	25/09/20	0%
362	MOEx		OPR	10 jours	14/09/20	25/09/20	0%
363	TCE		Levée des réserves OPR	15 jours	28/09/20	16/10/20	0%
364			**RECEPTION DES TRAVAUX Phase 1**	**0 jour**	**16/10/20**	**16/10/20**	**0%**
365			**Travaux phase 2**	**349 jours**	**17/06/19**	**07/12/20**	**36%**
366			**Gros oeuvre**	**34 jours**	**11/05/20**	**29/06/20**	**100%**
372	Sogea	01	Régie	5 jours	23/06/20	29/06/20	100%

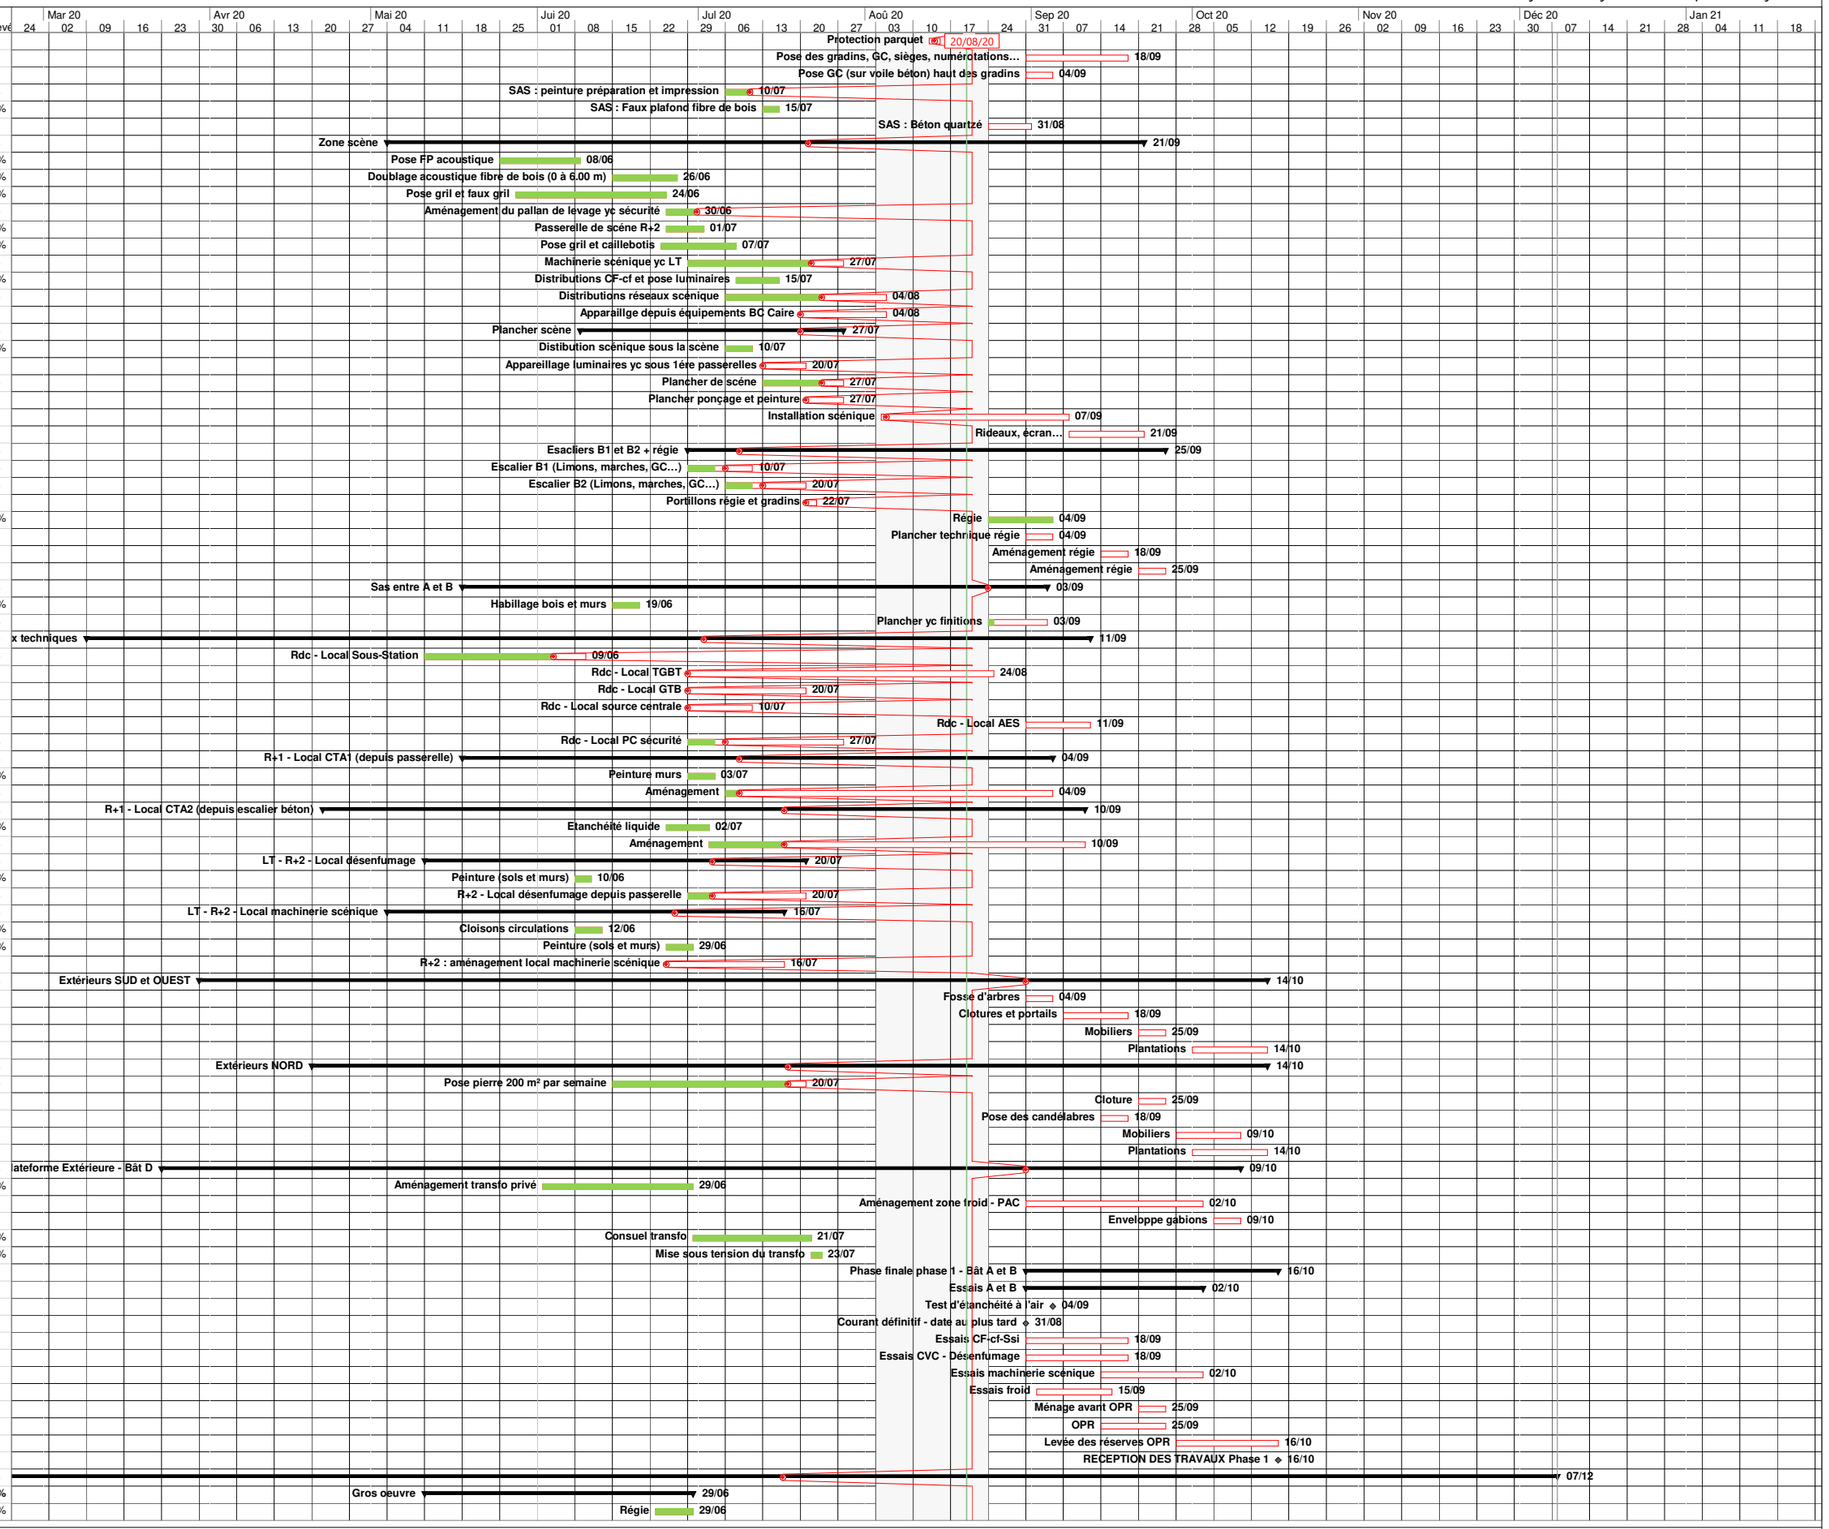

MANAGEMENT

Etabli par Ph HALADJIAN

BEZIERS TCE - Phase 1 et 2

Etabli le 29 novembre 2019
Mis a jour le 17 janvier 2020
Mis a jour le 21 février 2020
Mis a jour le 06 mars 2020 - V1
Mis a jour le 22 juin 2020 V1 puis le 29 juin V2

N°	Entreprise	Texl	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achevé
373	Sogea	01	Solde 3éme ceinture escaliers	5 jours	23/06/20	29/06/20	100%
378			**Zone Ascenseur**	**30 jours**	**18/05/20**	**30/06/20**	**100%**
381	Koné	13	Aménagement ascenseur	15 jours	25/05/20	12/06/20	100%
382	Cabrol	03	Passerelle zone gradins	2 jours	29/06/20	30/06/20	100%
383			**Charpente - Couverture et toiture béton**	**101 jours**	**11/05/20**	**28/10/20**	**55%**
385	Cabrol	03	Ossature principale charpente	25 jours	11/05/20	16/06/20	100%
386	Cabrol	03	Ossature secondaire charpente	11 jours	17/06/20	01/07/20	100%
387	Cabrol	03	Filets et mise en sécurité	2 jours	15/07/20	16/07/20	100%
388	Texen	16	Chemins de câbles	5 jours	17/07/20	23/07/20	0%
389	Cabrol	03	Passerelles yc caillebotis	10 jours	02/07/20	16/07/20	100%
390	BC Caire	14	GC sur passerelles	7 jours	02/07/20	10/07/20	90%
391	Cabrol	03	Bac toiture	10 jours	17/07/20	30/07/20	100%
392	Texen	16	Chemin de câble toiture	10 jours	17/07/20	30/07/20	0%
393	Cabrol	03	Etanchéité toiture	20 jours	31/07/20	23/09/20	0%
394	Cabrol	03	Zinguerie	5 jours	24/09/20	30/09/20	0%
395	Cabrol	03	Finitions joints debout	20 jours	01/10/20	28/10/20	0%
396			**Scéne**	**67 jours**	**02/07/20**	**30/10/20**	**12%**
397	Libes	08	Peinture sur étanchéité fosse	5 jours	02/09/20	08/09/20	0%
398	Friyed	04	Doublages partie basse scéne (0 à 06.00m)	7 jours	31/07/20	04/09/20	15%
399	Texen	16	CC et distributions scénique	15 jours	12/10/20	30/10/20	0%
400	BC Caire	14	Palan motorisé	5 jours	17/07/20	23/07/20	0%
401	BC Caire	14	Ligne de vie	5 jours	24/08/20	03/09/20	0%
402	BC Caire	14	Armoire machinerie	15 jours	02/07/20	23/07/20	0%
403	BC Caire	14	Machinerie Truss	10 jours	20/07/20	31/07/20	0%
404	BC Caire	14	Pose du proscenium	15 jours	10/08/20	28/08/20	70%
405	BC Caire	14	Elevateur PMR	5 jours	24/08/20	03/09/20	0%
406	BC caire	14	Montage Truss	5 jours	24/07/20	30/07/20	0%
407	BC Caire	14	Résine partie fixe	3 jours	20/07/20	22/07/20	0%
408	BC Caire	14	Résine sur partie mobile	3 jours	31/08/20	02/09/20	0%
409	Solatrag	07	Pose des portes monumenrtales	6 jours	20/07/20	27/07/20	0%
410			**Zone Courbe - CES**	**61 jours**	**19/06/20**	**09/10/20**	**24%**
412	Texen	16	Distributions réseaux scénique	6 sm	31/08/20	09/10/20	0%
413			**Sanitaires Jardin et Cour + local ménage**	**21 jours**	**19/06/20**	**20/07/20**	**57%**
416	Thermatic	11	Distribution PB	5 jours	22/06/20	26/06/20	100%
417	Friyed	04	Cloisons	10 jours	22/06/20	03/07/20	100%
418	Elec Service	12	Distribution électrique	6 jours	06/07/20	13/07/20	90%
419	Thermatic	11	Distribution Pb	6 jours	26/06/20	03/07/20	90%
420	Thermatic	11	Distributions ventillations	6 jours	26/06/20	03/07/20	90%
421	Friyed	04	Faux plafonds	8 jours	06/07/20	16/07/20	50%
422	Carayon	05	Pose des portes	2 jours	06/07/20	07/07/20	10%
423	Libes	08	Préparations cloisons	5 jours	06/07/20	10/07/20	0%
424	Libes	08	Peinture plafonds et murs	10 jours	29/06/20	10/07/20	0%
425	Thermatic	11	Appareillage Pb et ventillation	5 jours	29/06/20	03/07/20	0%
426	Elec Service	12	Appareillage Electrique	5 jours	13/07/20	20/07/20	0%
427	Carayon	05	Appareillage portes + séparation WC	3 jours	13/07/20	16/07/20	0%
428			**Circulations et stockages**	**29 jours**	**20/07/20**	**23/09/20**	**3%**
429	Elec Service	12	Distributions électrique	5 jours	20/07/20	24/07/20	20%
430	Libes	08	Peinture	10 jours	27/07/20	03/09/20	0%
431	Friyed	04	Faux plafonds fibre de bois	2 jours	04/09/20	07/09/20	0%
432	Solatrag	07	Pose portes et porte en barreaudage	4 jours	02/09/20	07/09/20	0%
433	Elec Service	12	Appareillage électrique	4 jours	08/09/20	11/09/20	0%
434	Libes	08	Peinture finitions	3 jours	14/09/20	16/09/20	0%
435	Solatrag	07	Pose des portes	5 jours	17/09/20	23/09/20	0%
436			**Gradins - Régie**	**25 jours**	**31/08/20**	**02/10/20**	**0%**
437	Sogea	01	Lasure sur béton	15 jours	31/08/20	18/09/20	0%
438	Solatrag	07	Pose de la serrurerie	10 jours	31/08/20	11/09/20	0%
439	Solatrag	07	Rideau métalique	3 jours	14/09/20	16/09/20	0%
440	Elec Service	12	Appareillage électrique	10 jours	14/09/20	25/09/20	0%
441	Carayon	05	Meuble régie	3 jours	28/09/20	30/09/20	0%
442	COS	15	Coques fixes	10 jours	21/09/20	02/10/20	0%
443			**Zone droite - Espace scène et annexes - CES**	**332 jours**	**17/06/19**	**12/11/20**	**33%**
446			**Escaliers 3 et 4**	**310 jours**	**17/06/19**	**13/10/20**	**14%**
447	Friyed	04	Cloisons RdC escalier 4	5 jours	15/07/20	21/07/20	100%
448	Pyr Charpente	02	Chassis désenfumage	2 jours	13/07/20	15/07/20	0%
449	Libes	08	Peinture	10 jours	16/09/20	29/09/20	0%
450	Carayon	05	Portes yc appareillages	2 jours	30/09/20	01/10/20	0%
451	Pyr Charpente	02	Appareillage désenfumage et essais	2 jours	30/09/20	01/10/20	0%
452	Solatrag	07	Main courante	10 jours	30/09/20	13/10/20	0%
453	Elec Service	12	Appareillage électrique	2 jours	17/06/19	18/06/19	0%
454	Libes	08	Nez de marches	2 jours	19/06/19	20/06/19	0%
455			**Locaux R+1**	**72 jours**	**11/05/20**	**17/09/20**	**42%**
458	Texen	16	Chemins de câbles et distributions	10 jours	15/06/20	26/06/20	0%
460	Friyed	04	Doublage et cloisons 1ére peau + imposte	7 jours	29/06/20	07/07/20	100%
461	Elec Service	12	Incorporations CF-cf	5 jours	08/07/20	15/07/20	100%
462	Thermatic	11	Incorporations Pb	5 jours	13/07/20	20/07/20	100%
463	Friyed	04	Cloisons seconde peau yc joints	5 jours	16/07/20	22/07/20	100%
464	Thermatic	11	Distributions CVC	5 jours	13/07/20	20/07/20	100%
465	Elec Service	12	Distributions CF-cf	5 jours	13/07/20	20/07/20	100%
466	Thermatic	11	Distributions Pb	5 jours	21/07/20	27/07/20	100%
467	Texen	16	Distributions complémentaires	10 jours	13/07/20	27/07/20	0%
468	Friyed	04	Faux plafonds placo yc joints	5 jours	23/07/20	29/07/20	90%
469	Reinaudo	10	Fourniture des siphons	0 jour	22/07/20	22/07/20	100%
470	Reinaudo	10	Etanchéité + carrelage	3 jours	27/07/20	29/07/20	20%
471	Reinaudo	10	Plinthes et fáience yc Spec	3 jours	30/07/20	24/08/20	10%
472	Carayon	05	Portes à peindre	1 jour	30/07/20	30/07/20	0%
473	Libes	08	Peinture	10 jours	30/07/20	08/09/20	10%
474	Friyed	04	Faux plafond fibre de bois	5 jours	09/09/20	15/09/20	0%

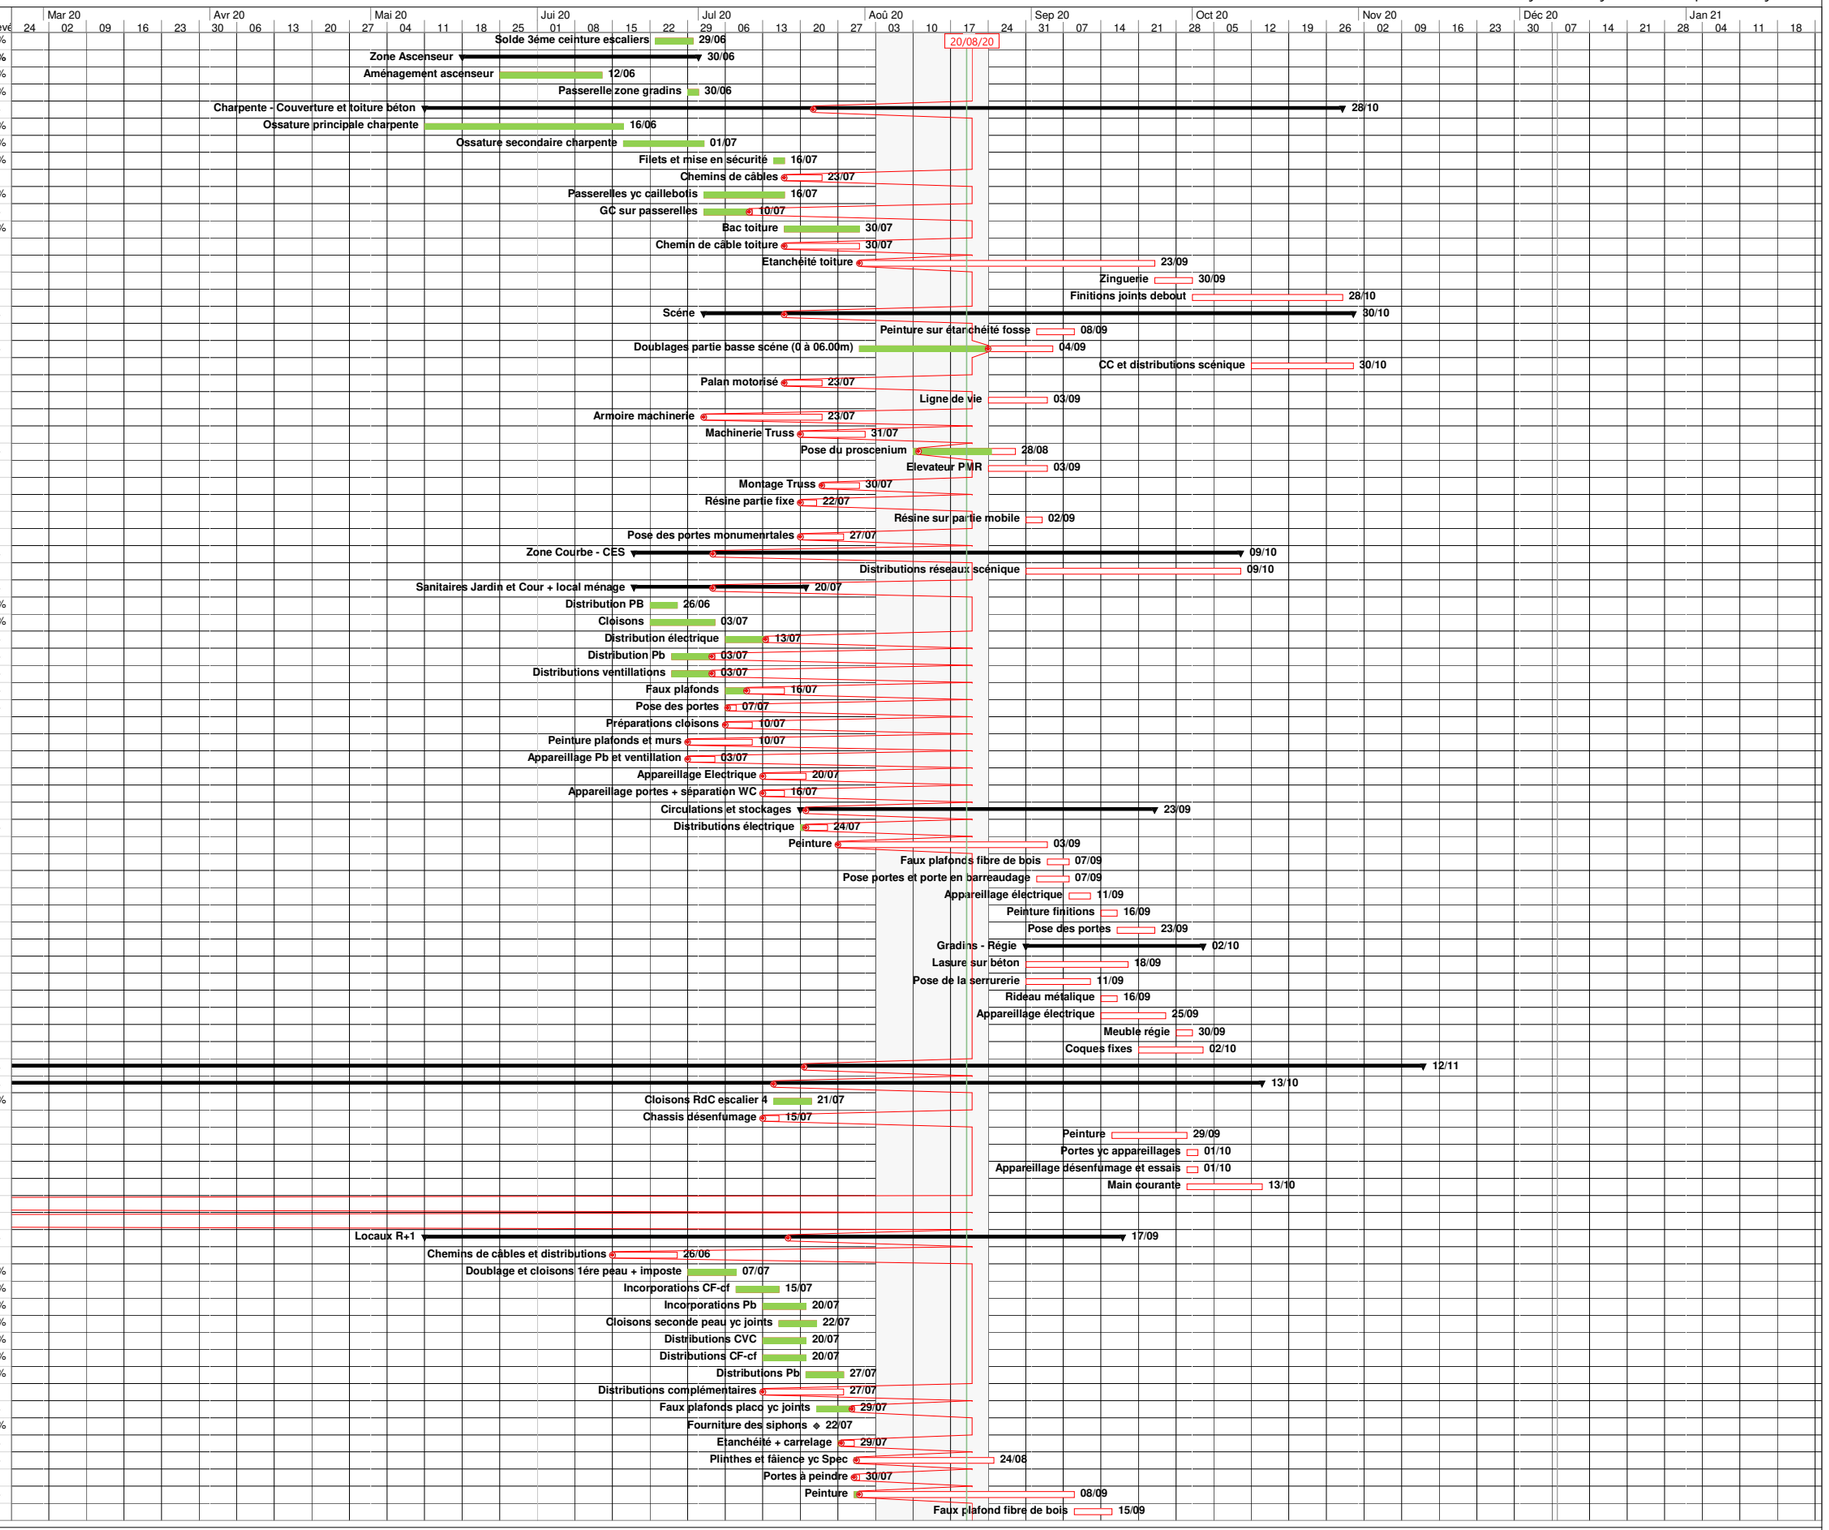

MANAGEMENT

Etabli par Ph HALADJIAN

BEZIERS TCE - Phase 1 et 2

Etabli le 29 novembre 2019
Mis a jour le 17 janvier 2020
Mis a jour le 21 février 2020
Mis a jour le 06 mars 2020 - V1
Mis a jour le 22 juin 2020 V1 puis le 29 juin V2

N°	Entreprise	Text	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achevé
475	Chuecos	09	Ragréage	2 jours	07/09/20	08/09/20	0%
476	Chuecos	09	Lino	4 jours	09/09/20	14/09/20	0%
477	Elec Service	12	Appareillage cf-cf	4 jours	09/09/20	14/09/20	0%
478	Thermatic	11	Appareillage Pb	4 jours	09/09/20	14/09/20	0%
479	Carayon	05	Appareillages portes	2 jours	15/09/20	16/09/20	0%
480	Carayon	05	Miroirs	1 jour	17/09/20	17/09/20	0%
481			**LT gradateurs R+1**	**15 jours**	**13/07/20**	**24/08/20**	**0%**
482	Texen	16	Aménagement LT gradateurs	15 jours	13/07/20	24/08/20	0%
483			**RDC - Arrière scène, locaux périphériques scène et circulations**	**112 jours**	**11/05/20**	**12/11/20**	**20%**
486	Thermatic	11	Distribution CVC	10 jours	22/06/20	03/07/20	0%
487	Thermatic	11	Distribution Pb	10 jours	06/07/20	20/07/20	0%
488	Elec Service	12	Chemin de câble	10 jours	22/06/20	03/07/20	30%
489	Texen	16	Chemin de câble et distributions	15 jours	31/08/20	18/09/20	0%
490	Friyed	04	Faux plafonds placo divers locaux CF	10 jours	06/07/20	20/07/20	0%
492	Friyed	04	Doublage et cloisons 1ére peau	10 jours	08/07/20	22/07/20	100%
493	Elec Service	12	Incorporations CF-cf	3 jours	23/07/20	27/07/20	0%
494	Thermatic	11	Incorporations Pb	3 jours	23/07/20	27/07/20	0%
495	Friyed	04	Cloisons seconde peau yc joints	4 jours	02/09/20	07/09/20	100%
496	Thermatic	11	Distributions CVC	5 jours	08/09/20	14/09/20	0%
497	Elec Service	12	Distributions CF-cf	5 jours	15/09/20	21/09/20	0%
498	Thermatic	11	Distributions Pb	5 jours	08/09/20	14/09/20	0%
499	Friyed	04	Faux plafonds placo yc joints	15 jours	22/07/20	07/09/20	100%
500	Reinaudo	10	Fourniture des siphons	0 jour	07/09/20	07/09/20	100%
501	Reinaudo	10	Etanchéité + carrelage	2 jours	08/09/20	09/09/20	0%
502	Reinaudo	10	Plinthes et fáience yc Spec	2 jours	08/09/20	09/09/20	0%
503	Sogea	01	Chape quartzé yc barrière étanche	7 jours	10/09/20	18/09/20	0%
504	Carayon	05	Portes à peindre	2 jours	21/09/20	22/09/20	0%
505	Libes	08	Peinture	15 jours	21/09/20	09/10/20	0%
506	Solatrag	07	Portes métalique coulissante	10 jours	28/09/20	09/10/20	0%
507	Friyed	04	Faux plafond fibre de bois	10 jours	12/10/20	23/10/20	0%
508	Chuecos	09	Barrière étanche et ragréage	5 jours	19/10/20	23/10/20	0%
509	Chuecos	09	Lino	5 jours	26/10/20	30/10/20	0%
510	Elec Service	12	Appareillage cf-cf	5 jours	12/10/20	16/10/20	0%
511	Thermatic	11	Appareillage Pb	5 jours	12/10/20	16/10/20	0%
512	Carayon	05	Appareillages portes	7 jours	02/11/20	10/11/20	0%
513	Carayon	05	Miroirs	2 jours	11/11/20	12/11/20	0%
514			**Extérieurs Phase 2**	**77 jours**	**02/06/20**	**14/10/20**	**41%**
516	Sogea	01	Fin pose escaliers extérieurs	6 jours	22/06/20	29/06/20	100%
517			**Façade**	**77 jours**	**02/06/20**	**14/10/20**	**61%**
518	Pyr Charpente	02	Solde portes Alu et désenfumage	5 jours	06/07/20	10/07/20	50%
520	Solatrag	07	Portes acier	5 jours	24/09/20	30/09/20	0%
522	Pyr Charpente	02	Couvertines panneaux bois	10 jours	07/09/20	18/09/20	0%
523	Sogea	01	Lasures sur béton	10 jours	21/09/20	02/10/20	0%
526			**Extérieurs NORD**	**30 jours**	**06/07/20**	**11/09/20**	**40%**
527	Colas	17	VRD nord (zone pierre et désactivé)	2 sm	06/07/20	20/07/20	100%
528	PSP	18	Fosse d'arbres	2 jours	21/07/20	22/07/20	100%
529	Colas	17	Remblai et réglage forme	5 jours	21/07/20	27/07/20	100%
530	Colas	17	Massif candélabres	5 jours	21/07/20	27/07/20	100%
531	Colas	17	Grave bitume	2 jours	03/08/20	04/08/20	100%
532	Colas	17	Pose des cornières d'arret Corten	10 jours	03/08/20	14/08/20	60%
533	Colas	17	Pose pierre 200 m² par semaine	5 sm	10/08/20	11/09/20	10%
534	Colas	17	Désactivé	3 sm	10/08/20	28/08/20	50%
535	Colas	17	Pose des candélabres	5 jours	31/08/20	04/09/20	0%
536	PSP	18	Plantations	10 jours	21/07/20	28/08/20	0%
537	PSP	18	Mobiliers	10 jours	31/08/20	11/09/20	0%
538			**Extérieurs SUD et ENTREE**	**38 jours**	**17/07/20**	**05/10/20**	**15%**
540	Colas	17	VRD	10 jours	20/07/20	31/07/20	100%
541	PSP	18	Fosse d'arbres	5 jours	24/08/20	03/09/20	0%
542	Colas	17	Remblai et réglage forme	5 jours	04/09/20	10/09/20	0%
543	Colas	17	Accès livraison	5 jours	24/08/20	03/09/20	0%
544	Colas	17	Accès principal	5 jours	04/09/20	10/09/20	0%
545	Colas	17	Bordures	7 jours	04/09/20	14/09/20	0%
546	Colas	17	Enrobès	5 jours	15/09/20	21/09/20	0%
547	Colas	17	Clotures et portails	10 jours	22/09/20	05/10/20	0%
548	PSP	18	Plantations	10 jours	08/09/20	21/09/20	0%
549	PSP	18	Mobiliers	5 jours	22/09/20	28/09/20	0%
550			**Phase finale phase 2**	**61 jours**	**14/09/20**	**07/12/20**	**0%**
551			**Essais Bât C**	**30 jours**	**14/09/20**	**23/10/20**	**0%**
552	Elec Service	12	Courant définitif	0 jour	14/09/20	14/09/20	0%
553	BC Caire	14	Essais proscenium	5 jours	14/09/20	18/09/20	0%
554	Sogea	01	Essais pompe	5 jours	28/09/20	02/10/20	0%
555	Elec Service	12	Essais CF	15 jours	14/09/20	02/10/20	0%
556	Elec Service	12	Essais cf-Ssi	15 jours	05/10/20	23/10/20	0%
557	Thermatic	11	Essais CVC	10 jours	14/09/20	25/09/20	0%
558	BC Caire	14	Essais Truss	2 jours	28/09/20	29/09/20	0%
559	Thermatic	11	Essais froid	5 jours	28/09/20	02/10/20	0%
560	Koné	13	Essais ascenseurs	5 jours	28/09/20	02/10/20	0%
561	Libes	08	Ménage avant OPR loges, sanitaires, circulations	5 jours	13/11/20	19/11/20	0%
562	MOEx		OPR loges,sanitaires, circulations	10 jours	06/11/20	19/11/20	0%
563	TCE		Levée des réserves	10 jours	20/11/20	03/12/20	0%
564	TCE		OPR scène, gradins, régie	5 jours	20/11/20	26/11/20	0%
565	TCE		Levée des réserves	5 jours	27/11/20	03/12/20	0%
566	Libes	08	Ménage final	2 jours	04/12/20	07/12/20	0%
567			**RECEPTION DES TRAVAUX Phase 2**	**0 jour**	**07/12/20**	**07/12/20**	**0%**

AIA MANAGEMENT

Construction d'une salle de spectacle Domaine de Bayssan

Domaine de Bayssan
Béziers

Compte-rendu de réunion n°55

19/08/2020

Prochaine réunion le mercredi 26/08/2020 à 13:30

AIA MANAGEMENT

Opération :	**Construction d'une salle de spectacle Domaine de Bayssan**
Numéro d'affaire :	20180404
Client :	Département de l'Hérault
Adresse du chantier :	Domaine de Bayssan Béziers
Téléphone du chantier :	

Compte-rendu de réunion n°55 du 19/08/2020 - S34

Prochaine réunion le mercredi 26/08/2020 à 13:30, Sur site. .

Présence demandée suivant le tableau ci-dessous.

N°	RÔLE	ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M	Cn	P/A/E	Cn+1	Diff
1	MAITRE D'OUVRAGE	Département Hérault		Mme Hélène AVRIL Chargés d'opération havril@herault.fr	Tél. : 04 67 67 67 17 Port. : 06 85 71 79 51	C	P	C	X
2	ARCHITECTE	K-ARCHITECTURES		M. Thomas EHRHARDT k.thomasehrhardt@gmail.com	Tél. : 01 53 26 36 45	C	E	C	X
				Mme Karine HERMAN kh@k-architectures.com	Tél. : 01.53.26.36.45			C	X
3	OPC	AIA Management	20 Rue Lortet 69007 LYON	M. Philippe HALADJIAN OPC p.haladjian@a-i-a.fr	Port. : 06 99 47 40 92	C	P	C	X
4	BET STRUCTURE	BATISERF		M. Cécile PLUMIER cecile.plumier@batiserf.com	Tél. : 04 76 24 83 80				X
5	BET FLUIDES	CHOULET		M. Samir DIFAA (CF-cf-SSi) sdifaa@betchoulet.fr					X
				M. Benjamin DOUAUD (HQE) bdouaud@betchoulet.fr					X
				M. Ludovic DUHEM (CVC) lduhem@betchoulet					X
6	ECONOMISTE	BMF		Pas de contact associé					
7	ACOUSTICIEN	ALTIA		M. Guillaume BOURDIN guillaume.bourdin@altia-acoustique.com					X
8	PAYSAGISTE	VOLGA		M. Ariane DESIREE	Tél. : 09 53 12 47 25				
9	BET VRD	ATEVE		M. Erwan LE HELLOCO erwan.le-helloco@ateve.fr					X
10	SCENOGRAPHE	CHANGEMENT A VUE		M. Aniruddha KUDALKAR a.kudalkar@cav-sceno.com	Port. : 06 63 79 19 96				X
11	BUREAU DE CONTROLE	DEKRA		M. Laurent PIQUET laurent.piquet@dekra.com	Port. : 06 23 24 31 56				X
12	COORDONATEUR SPS	LM COORDINATION		M. Jean-François JOSEPH jfjoseph@lmcoordination.fr	Port. : 07 68 86 25 96				X

N°	LOT	ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M	Cn	P/A/E	Cn+1	Diff	Eff	Pen
00	Interfaces entre lots	Interfaces entre lots		Pas de contact associé							
01	GO - Terrassement	SOGEA		M. Julien CABANE julien.cabane@vinci-construction.fr	Port. : 06 81 21 06 06				X	0	
				M. Guillaume SEVELY guillaume.sevely@vinci-construction.fr	Port. : 0616755542	C	P	C	X	4	
01A	Etanchéité	SOGEA		M. Guillaume SEVELY						0	
02	Charpente - Bardage - Couverture - Menuiseries ext.	Pyrénées Charpente		M. Mathieu MESSAGER m.messager@pyrenees-charpentes.fr	Port. : 06 63 20 89 95				X	0	2
03	Charpente Métallique - Couverture bac acier	CABROL		M. Jeremy CAVAILLES jcavailles@cabrol.fr	Tél. : 05.63.61.38.71				X		
				M. Aurélien VERTADIER avertadier@cabrol.fr	Tél. : 06.16.72.19.08	C	A	C	X	0	
04	Cloisons -	FRIYED et Fils	Malves en Mine	M. Sébastien FRIYED	Tél. : 07.85.47.62.99	C	A	C		0	

	Doublage - FP										
05	**Menuiseries Intérieures**	**CARAYON**		M. Franck CARAYON franck.carayon@menuiseriecarayon.com	Tél. : 04 67 31 07 91	C	A	C	X	0	3
06	**Parquet**	**TECHNISOL**		M. Jean-Pierre BERNIER jpb.technisol@gmail.com	Port. : 06 01 39 04 15	C	A	C	X	4	2
07	**Serrurerie - Métallerie**	**SOLATRAG**	2 Rue de Chiminie 34300 Agde	M. Benjamin AUGUET b.auguet@solatrag.fr	Port. : 06.50.95.70.13	C	A	C	X	0	
08	**Peinture**	**LIBES**		M. Alain ARNAL etudes.montpelier@sopesud-libes.com	Port. : 06 46 78 78 70				X	0	3
				M. Victor HENRIQUEZ	Port. : 06.25.32.27.76	C	P	C		0	
				M. Bernard LUQUE travaux.beziers@sapesud-libes.com	Tél. : 06.03.84.05.73				X	0	
09	**Sols Souples**	**CHUECOS**		M. Michel CHUECOS michel.chuecos@wanadoo.fr	Port. : 06 09 53 00 87			C	X	0	
10	**Carrelage - Faïence**	**REINAUDO**		M. REINAUDO reinaudocarrelage@wanadoo.fr	Port. : 06.60.70.57.48	C	A	C	X	0	
11	**Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie**	**THERMATIC**		M. Guillaume BLANC guillaume.blanc@thermatic.fr	Port. : 06 50 18 60 83				X		
				M. Xavier DUBOURDIEU xavier.dubourdieu@thermatic.fr	Port. : 06 50 18 60 02	C	E	C	X	5	
12	**Electricité**	**ELECTRICITE SERVICE**		M. Renaud BIGOUD rbigou@gmail.com	Port. : 06 27 32 27 88	C	A	C	X	3	
				M. Olivier JOUI jouiolivier@yahoo.fr	Port. : 06 20 62 11 54				X		
13	**Ascenseur**	**KONE**		M. Sébastien FORTUNE sebastien.fortune@kone.com	Port. : 06 32 91 06 22				X	0	
14	**Machinerie scénique**	**BC CAIRE**		M. Jean-Michel LAPEYRE jeanmichel.lapeyre@bc-caire.com	Tél. : 04 79 54 41 21				X	0	
				M. William LARRIEU william.larrieu@bc-caire.com	Port. : 06 16 95 52 75	C	A	C	X	7	5
15	**Gradins télescopique**	**COS**		M. Gonzague DEHAEZE gonzague.dehaeze@colhez.fr	Port. : 06 95 92 92 86			C	X		
16	**Réseaux scéniques**	**TEXEN**		M. François MONDIE f.mondie@texen.fr	Port. : 06 82 67 77 28	C	A	C	X	0	1
17	**V.R.D.**	**COLAS**	43 Rue des Entreprises 74550 PERRIGNIER	M. Charles LANGUE charles.langue@colas-mm.com	Port. : 07 62 92 79 89	C	A	C	X	12	1
18	**Espaces Verts**	**PSP**		M. Jean-Noël COUTIER jean-noel.coutier@lajus.fr	Port. : 06.16.17.90.85	C	A	C	X	0	1
				M. Antoine MULLER antoine.muller@lajus.fr	Tél. : 04 67 74 54 61				X		1
100	**Equipement Cuisine**	**THERMASUD**		M. Maxime GUERARD realisation@thermosud.fr	Port. : 06 20 02 70 88				X	0	
				M. Leslie SAUVAN be@thermasud.fr					X	0	

Légende : Cn : Était convoqué à la réunion – Cn+1 : Convoqué à la prochaine réunion – P : Présent – A : Absent – E : Excusé – Diff : Diffusion – Eff : Effectif de la semaine – Pen : Pénalité

1 - PHOTOS	CRÉÉE LE	STATUT

2 - REMARQUES TCE	CRÉÉE LE	STATUT

3 - SANTÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ	CRÉÉE LE	STATUT

4 - PPSPS

Entreprise	VIC	PPSPS
BC CAIRE - Machinerie scénique		
CABROL - Charpente Métallique - Couverture bac acier		
CARAYON - Menuiseries Intérieures		
CHUECOS - Sols Souples		
COLAS - V.R.D.		
COS - Gradins télescopique		
ELECTRICITE SERVICE - Electricité	01/07/2019	29/07/2019
FRIYED et Fils - Cloisons - Doublage - FP		
Interfaces entre lots - Interfaces entre lots		
KONE - Ascenseur		
LIBES - Peinture		
PSP - Espaces Verts		
Pyrénées Charpente - Charpente - Bardage - Couverture - Menuiseries ext.		
REINAUDO - Carrelage - Faïence		
SOGEA - Etanchéité		
SOGEA - GO - Terrassement	16/09/2019	30/04/2019
SOLATRAG - Serrurerie - Métallerie		
TECHNISOL - Parquet		
TEXEN - Réseaux scéniques		
THERMASUD - Equipement Cuisine		
THERMATIC - Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie	24/04/2019	09/09/2019

5 - INTEMPÉRIES	DÉBUT	FIN
Pluie : 11 jours + 06 jours de sinistre catastrophe naturelle 09.07.2019 : pluie - blocage terrassement Sogea 10.09.2019 : pluie - blocage travaux de GO 22-23.10.2019 : fortes pluies - blocage GO et charpentier bois 24-25.10.2019 : remise en état du chantier GO suite aux fortes pluies + (28-29-30-31 octobre 19) 13.12.19 : pluie et vent : blocage pose pré-murs 17.01.20 : forte pluie : blocage prémurs, plancher C + étanchéité fosse C 23.01.20 : pluie 11 et 13 mai 2020		
Vent : 23 jours 05.09.2019 : vent - blocage GO 25.09.2019 : vent - perte de cadence GO après-midi pose prémurs bât B 03.10.2019 : vent - perte de cadence GO après-midi pose prémurs bât B 07.10.2019 : vent - perte de cadence GO après-midi pose prémurs bât B 14 et 15.10.2019 - blocage GO 18.11.2019 : vent - perte de cadence GO 09.12.2019 : vent blocage pose pré-murs GO et MOB charpentier bois. 19.12.19 : vent blocage pose pré-murs 20.12.19 : vent blocage pose pré-murs 23 et 24.12.19 : vent blocage pose pré-murs 28.01.20 : vent blocage pose pré-murs 04-10-11-19.02.20 : vent blocage pose pré-murs 25-26 et 27.02.20 : vent blocage pré-murs, coulage, planchers 02.03.20 : vent blocage charpentier et GO 05-06.03.20 : vent		

6 - AVANCEMENT

Construction d'une salle de spectacle Domaine de Bayssan /

Avancement	%	Date prévue	Date réelle
Covid-19 : OS arrêt le 16 mars 2020 et OS reprise le 23 mars 2020 Inactivité sur le chantier du lundi 17 mars jusqu'au lundi 27 avril 2020 Effectif mercredi 11 mars : 69 personnes Effectif mercredi 29 avril : 17 personnes Effectif mercredi 20 mai : 62 personnes. Impact minimum sur le planning environ 08 semaines plus perte de cadence environ 04 semaines à la reprise liée aux mesures Covid.	100%		

Construction d'une salle de spectacle Domaine de Bayssan / Bât A - Accueil - Restaurant selon calendrier du 22 juillet 2019

Avancement	%	Date prévue	Date réelle
Fin du Gros œuvre	100%	30/08/2019	05/09/2019

Début MOB - Clos et Couvert	100%	02/09/2019	23/09/2019
Fin du Clos et Couvert cuisine	100%	16/10/2019	20/11/2019
Fin du Clos et Couvert	100%	30/10/2019	15/11/2019
Début des CES	100%	16/10/2019	25/11/2019

Construction d'une salle de spectacle Domaine de Bayssan / Bât B - Salle de spectacle selon calendrier du 22 juillet 2019

Avancement	%	Date prévue	Date réelle
Fin pose pré-murs	100%	27/09/2019	25/10/2019
Fin plancher Gros œuvre	100%	18/10/2019	14/11/2019
Début MOB + durée 03 semaines	100%	30/09/2019	18/11/2019
Début panneaux de toit + durée 03 semaines	100%		06/01/2020
Fin panneaux de toit	100%		03/03/2020
Fin du Clos et couvert	100%	07/01/2020	03/03/2020
Début CES arrière scène (avec étanchéité provisoire)	100%	06/01/2020	06/01/2020
Début CES zone gradins	100%	10/02/2020	10/02/2020
Fin Gril-Faux gril	100%		03/07/2020

Construction d'une salle de spectacle Domaine de Bayssan / Bât C - Amphithéâtre selon calendrier du 22 juillet 2019

Avancement	%	Date prévue	Date réelle
Fin du Gros œuvre zone droite	100%		06/03/2020
Clos et couvert zone droite	100%		05/06/2020
Fin du Gros œuvre zone courbe	100%	05/06/2020	19/06/2020
Clos et couvert zone courbe	100%	12/06/2020	12/06/2020
Début charpente métal	100%		09/03/2020
Début CES plâtreries	100%	15/06/2020	29/06/2020

7 - COORDINATION	CRÉÉE LE	STATUT
1 - Département Hérault - MAITRE D'OUVRAGE :		
2 - K-ARCHITECTURES - ARCHITECTE :		
3 - AIA Management - OPC :		
4 - BATISERF - BET STRUCTURE :		
5 - CHOULET - BET FLUIDES :		
6 - BMF - ECONOMISTE :		
7 - ALTIA - ACOUSTICIEN :		
8 - VOLGA - PAYSAGISTE :		
9 - ATEVE - BET VRD :		
10 - CHANGEMENT A VUE - SCENOGRAPHE :		
11 - DEKRA - BUREAU DE CONTROLE :		
12 - LM COORDINATION - COORDONATEUR SPS :		

8 - SUIVI PAR LOT	CRÉÉE LE	STATUT
00 - Interfaces entre lots - Interfaces entre lots :		
Informations générales		
Avis Bureau de Contrôle : - répondre sous 10 jours aux avis du BC	24/06/2020	
Retard : le maitre d'ouvrage a informé les entreprises lors de la réunion de chantier du mercredi 08 juillet 2020 qu'un courrier allait être envoyé à tous pour expliquer que les pénalités de retard allaient être appliquées.	08/07/2020	
L'ensemble des entreprises s'engage à nettoyer/désencombrer le chantier avant le vendredi 7 août. A compter du lundi 10 août, si tel n'est pas le cas un nettoyage s'imputera sur le compte prorata.	05/08/2020	
Rappel : attention la dernière entreprise à quitter le chantier doit penser à bien fermer le parking chaque soir. Code boîte à clés : 2692	05/08/2020	
Rappels de Mr. Guittard (service voirie grand travaux du département) aux entreprises : • Le stationnement de véhicules côté gauche de la voirie est strictement interdit • Les ralentisseurs routiers doivent être indiqués par des panneaux de signalisation (voir avec Colas) • Sogea : les bennes de chantier doivent être positionnées en longueur sur le bas-côté	05/08/2020	
A compter du 16/09/20 la salle de réunion du chapiteau ne sera plus réservée à cet usage.	05/08/2020	

Interfaces entre lots Bât A		
Pré-OPR effectuée entre le 20 et 24 juillet sauf sol quartzé. Lever des observations par les entreprises pour début septembre	27/05/2020	
Bât A Zone Chape : • Carayon : plans pour banque et bar diffusés. Pose selon planning après bouche pore.		
Bât A : Toutes zone Rdc yc local ménage : • Lots technique : finir appareillage • SOGEA : réalisation bouche-pore à exécuter selon planning • Libes : solde peinture portes cuisine (sanitaires) prévue après leurs appareillages	29/01/2020	En cours 90%
Terrasse : • Libes : peinture à enchainer en septembre après la pierre marbrière	08/07/2020	
Bât A : LT du R+1 yc escalier • Thermatic : début aménagement LT à partir du 02.03.20. Rappel à débuter URGENT. En cours depuis le 02.06.20	02/06/2020	En cours 80%
Bât A : sous-station • Thermatic : début distribution vers R+1 et reboucher réservation. Début confirmé le 08.06.20 pour 03 semaines. Début réel le 15.06.20. Mise en eau pour septembre 20 à réaliser	08/06/2020	En cours 80%
Interfaces entre lots Bât D et extérieurs		
Bât D • Solatrag : pose porte en parallèle des gabions. Fabrication en cours • Elec Service : mise sous tension transfo pour le 28 juillet effective et TGBT pour début septembre • Colas : programmer pose des gabions (plan exe mi juin pour une pose pour fin août). Rappel n°5 • Thermatic : livraison PAC fin aout. • TCE : Blocage de l'entrée le 28/08/20.	29/01/2020	
Extérieurs sud • Pyr Charpentes : Solde vers mi-septembre après travaux autres lots • Colas : Clôtures (plans exe pour le 09.06.20) approvisionnement environ 05 semaines. A poser pour fin juillet yc portail. Commande passée. Premiers linéaires pour la première quinzaine d'août. URGENT	05/02/2020	
Extérieurs nord • Colas : pose de la pierre depuis le 10 juin 20. (cadence environ 40-50m²/jour). Fin le 24 juillet. Attention aux cadences insuffisantes pour la phase 2. Le 22 juillet, le poseur confirme en renfort pour tenir les cadences de la phase 2 (06 personnes). • Colas pose des mats yc tirage des câbles environ 05 jours (Phase 1 et 2) pour fin aout 20 • Colas : les séparatifs en acier Corten se décollent en phase 1 entre les pierres marbrières et le béton désactivé. A refixer avant la réalisation des joints.	29/01/2020	
Interfaces entre lots Bât B		
Bât B : zone placo rdc • Friyed : Pose des FP semi-démontables en cours. Attention à Thermatic qui doit suivre et lots techniques pour les calfeutrements (pour le 24 juillet). • Thermatic / Texen / Electricité Service : réservations à boucher pour le 24.07 en vue de la fermeture des plafonds. Les entreprises doivent confirmer la fin de cette tâche par envoi de PV de calfeutrement. Retard d'une semaine au 06/08/20. Rappel	29/01/2020	
Bât B : espace gradin • Solatrag : escalier B1-B2 pose marches et GC à partir du 24 aout • Carayon : poser plancher régie en fonction de l'avancement de Texen • BC Caire : poser pieds de l'échelle. Pieds posés le 30/07/20. Finalisation de l'échelle et fixation de la passerelle au mur prévues pour septembre. Attention aux chemins de câbles de Texen. • Technisol : pose en cours depuis le 20 juillet. A finir avant le 21 aout y compris protection. Suite à une erreur de livraison la pose a débuté le 17 aout. • COS : livraison gradins pour le 26 aout 20 durée 03 semaines (2 semaines structure + 1 semaine sellerie) • Libes : finitions noires après parquet.	29/01/2020	
Bât B : espace scène • BC Caire : Rail Halfen à reposer • BC Caire : machinerie du 29 juin à fin juillet. Début travaux électriques machinerie au mois d'août. Début travaux mécaniques machinerie les deux premières semaines de septembre. • BC Caire : Parquet scène à partir du 13.07.20 jusqu'au 29 juillet et solde en septembre. • Texen : début le 06 juillet (4 à 6 personnes). Travaux en cours jusqu'au 28/07. Attention aux effectifs. Effectifs en baisse dû à la contamination d'un atelier de fabrication au COVID-19. Date de fin des tirages de câbles prévue pour le 20.08.20. • BC Caire : ajuster le niveau entre la scène et l'aire de livraison pour ne pas avoir de ressaut.	29/01/2020	
Bât B : LT CTA nord • Thermatic : livraison le 03.03.20. Rappel. retard 06 semaines. Début recalé à fin juin jusqu'à fin juillet. avancement 0% au 10.07.20. Effectif insuffisant. Début réel le 21 juillet pour 04 semaines pour les gaines. 70% d'avancement au 05/08/20. • Thermatic : dégradation du relevé d'étanchéité sur placo. • Thermatic-Sogea : pose et raccordement des siphons pour fin août.	25/05/2020 Rappel 4	En cours 30%
Bât B : LT sud – CTA • Thermatic : A débuter. Démarrage le 20.07.20. Avancement 0% au 10.07.20. Effectif insuffisant. Rappel. Avancement 0% au 29.07.20. Report du démarrage au milieu de la première semaine d'août. Durée de 4 semaines pour les gaines. Début réel le 05/08/20. Avancement 40% au 19 aout • Thermatic-Sogea : pose et raccordement des siphons pour fin août.	12/02/2020 Rappel 3	En cours 5%
Local désenfumage :	19/02/2020	En cours

• Thermatic : débuter pose des gaines		40%
Local machinerie : • BC Caire : avancer aménagement du local. En cours. A solder avant fin aout	15/07/2020	En cours 10%
Bât B : Escaliers • Friyed : solder escalier pour fin juin + coordonner scotch avec Pyr Char. Rappel n°2.	06/05/2020	
Bât B : Clos et couvert • Solatrag : portes à poser pour mi-juillet yc accès salles. Retard IMPORTANT. Pose probable des portes en septembre. Prévoir une porte provisoire à l'entrée de la grande salle.	25/05/2020 Rappel 5	
Circulations : • Sogea : Attention à la poussière sur les faux-plafonds noirs pendant le sciage. Nettoyage requis. • Libes : préparer support béton • Solatrag : pose des portes	22/07/2020	
Interfaces entre lots Bât C et extérieurs		
• Sogea : dalettes sur étanchéité pour fin juin. A faire livrer. Reporté : nouvelle date d'intervention à définir. • Cabrol : finitions charpente en cours et pose des filets 15-16 juillet Report au 23 juillet. En cours. Fin réelle fin juillet. • Cabrol : Pose des bacs à partir du 20 juillet 2020. A solder pour le 07 aout impérativement. Grutage des bacs effectué le 29.07.20 et grutage étanchéité toiture prévu pour le 24.08.20. • Thermatic : canaliser les EP pour le 10.06.20. A solder. Urgent. Rappel n°5. Fin de tâche prévue pour le 10.07.20. Pyr Charpentes : pose du solde des portes et du désenfumage pour fin aout • Carayon : commande du cadre gaine technique sous escaliers passée la semaine du 20.07.20. Pose prévue pour septembre.	29/01/2020	
Extérieurs : • Colas : VRD nord à partir du lundi 06 juillet + grave bitume 03 et 04 aout. Retard : grave bitume reporté à la semaine du 10 aout suite à un souci de portance. Nouveaux essais à la plaque le 07/08/20. • Début de la pierre et des désactivés le 10 juillet au plus tard. Reporté au 12 aout. • K : confirmer la création de deux EP complémentaires • K et Colas : position poteaux incendie à finaliser (en particulier celui vers le portail pompiers phase 1)	10/06/2020	
Zone gradins : • Sogea : finitions sur béton à réaliser pour fin juillet • Sogea : lasure béton en juillet-aout côté intérieur amphi et septembre pour les façades. Echantillons validés par K. Attention pose des sièges à partir du 21 septembre. Visa 59 reçu. • Libes : montage d'un échafaudage gradins semaine 35. A démonter impérativement courant de S38.	08/07/2020	
Scène : • Sogea : finitions GO en cours • BC Caire : pose GC et machinerie truss à partir du 20 juillet. Blocage par les bacs. Décalée au 10/08 après-midi. (fin de la pose des bacs) • BC Caire : pose table levante à partir du 10 aout. En cours 70% • BC Caire : pose du truss en septembre • Texen : modèle du coffret son et lumière sur passerelle à valider par l'utilisateur	03/06/2020	
CES : début le 15 juin 2020 • TCE : début des CES 22 juin 20. Friyed n'est pas en capacité de débuter le 11.05.20 faute d'effectif. Début réel le 23 juin. • Reinaudo : pose du carrelage à partir du 24/08 • Friyed : fin zone Est RDC, R+1 yc les joints pour le 31/07. Report : fin prévue pour le 07/08 pour les joints. Intervention du peintre juste en suivant. • Libes : peinture mur régie extérieure et mur sous toiture côté terrasse prévue la semaine du 10/08/20. en cours • Libes : Peinture de la zone Ouest R+1 prévue le 10/08/20.	03/06/2020	

01 - SOGEA - GO - Terrassement :

Travaux Bât A		
Travaux GO fini le 06.09.2019.	06/09/2019	Fait le 06/09/2019
Travaux Bât B et D		
Bât B : finitions GO en cours Bât D : GO en cours	22/01/2020	
Travaux Bât C		
Compte tenu du retard, Sogea précise le 18.12.19 travailler en horaires étendues. Un éclairage de chantier sera mis en place pour le travail en fin d'après midi.	18/12/2019	Fait le 10/01/2020
Pose des prémurs à partir du 12 novembre 2019. Report au 19 novembre suite aux intempéries puis au 25.11.19.	16/10/2019	En cours 95%
Planchers gradins en cours	04/03/2020	En cours 20%
Reprise des platines pour Cabrol à partir du 04.11.20 + coulage contre dalle	29/04/2020	À faire pour le 04/05/2020

01A - SOGEA - Etanchéité :

Travaux		
Travaux Etandex à partir du 20 janvier 2020 contre le 06.01.20. En cours depuis le 13 janvier. Fini	08/01/2020	Fait le

		07/02/2020
Etanchéité Bât D	29/04/2020	En cours 90%
Etanchéité Bât D Ouest pour le 07.05 Etanchéité Bât D Est pour le 07.05. A coordonner avec Thermatic pour la collecte des EP Etanchéité dalle ascenseur à suivre	29/04/2020	

02 - Pyrénées Charpente - Charpente - Bardage - Couverture - Menuiseries ext. :

ETUDES		
so		
Travaux		
L'entreprise refuse de signer le planning pour le Bât A. Par rapport au planning du 22 juillet, la date de début est reportée de 3 semaines. La durée des travaux du DCE est à respecter impérativement.	11/09/2019	
Travaux bât A		
Début des travaux le 02 septembre. L'entreprise précise en réunion le 21 aout avoir reporté sa fabrication au motif que des éléments étaient incertains dans la synthèse. Impact planning 3 semaines. L'OPC précise le 21 aout que les murs extérieurs ne sont pas concernés par ce sujet et que la pose doit débuter. L'entreprise n'a pas tenue compte de cette directive.	26/06/2019	Fait le 28/11/2019
Retard projeté sur le hors d'eau : 10 jours. Impact direct sur le décalage des CES	16/10/2019	Fait le 28/11/2019
Travaux en cours depuis le 23 septembre 2019. Fin MOB intérieur et extérieur : vendredi 04 octobre et finitions le 17.10.19 sauf pare-vapeur Pose des panneaux de toit à partir du 21.10 mais possible depuis le 14.10.19 Assurer le hors d'eau pour le 31.10.19 sous la zone du LT Assurer le hors d'eau pour le 08.11.19 pour le solde Dépose de la cerce à programmer pour vendredi 08.11.19 ou le 12.11.19 au plus tard. Attention ne pas bloquer les CES. Le 13.11.19 : pose des panneaux de toit en cours. Fin confirmé pour le 15.11.19. Début des CES le 18.11.19. Dépose de la tour et pose de la coiffe en cours le 20.11.19	25/09/2019	Fait le 28/11/2019
Pose des menuiseries ext. à poser selon calendrier exe. Retard deux semaines. Début confirmé à partir du 28.10.2019 et début vitrage le 04.11.19. Vitrage en cours 13.11.19. Fin le 15.11.19. Vitrage encore en cours le 20 novembre. Bloquer les portes	16/10/2019	Fait le 28/11/2019
Pointage du 06.11.19. Date évoquée par entreprise - Fin toiture le 15.11.19 hors finitions. Fin du clos et couvert le mercredi 20 novembre 2019 - Fin Menuiseries Ext. le 15.11.19 - Fin bardage le 08.11.19. Fini.	06/11/2019	Fait le 15/11/2019
Travaux en cours sur les finitions du clos et couvert en toiture avec dépose de la cerce et pose de la coiffe. Dépose cerce en cours le mercredi 20 novembre 2019.	20/11/2019	
Pose des bandeaux effectuée entre le 05.12 et le 11.12. Avancement 90%. Finitions toiture entre panneaux à solder. Entrée d'eau possible	11/12/2019	
Suite aux fortes pluies plusieurs entrées d'eau. Les coiffes des noues seront posées à partir de lundi 27 janvier 2020.	22/01/2020	En cours 80%
Travaux bât B		
Test étanchéité à l'air : - faire une visite préalable pour permettre les reprises par tous les lots. - test à programmer dès la fin des panneaux de toit.	08/01/2020	À faire pour le 22/01/2020
Pose poutres échelles et charpente métal à partir du 21 octobre. Travaux reportés au 04 et 05 novembre suite aux intempéries du 22 et 23 octobre.	25/09/2019	Fait le 15/11/2019
MOB : Début possible depuis le 14 octobre. Avancement 0%. Le 06.11.19 l'entreprise précise débuter le 18 novembre 2019. Avancement 0% au 13.11.19. Avancement 10% au 20 novembre. Mercredi 20 novembre équipe mobilisée sur le Bât A. Pas d'avancement sur B. Le 20.11.2019 AIA demande à nouveau un renfort de l'effectif pour finir les travaux au 06 décembre. Avancement au 27.11.19 : 35% Avancement au 04.12.19 : 80% Avancement au 11.12.19 : 90% Avancement au 18.12.19 : 100% yc descente EP	09/10/2019	Fait le 31/01/2020
Le 06.11.19 : l'entreprise précise assurer le clos et couvert pour le 20 décembre 2019. AIA demande le 27.11.19 quelques dates : - fin pose MOB. Confirmé pour le 06.12.19 - début et fin de pose des panneaux de toit. Confirmé pour fin janvier 2020 puis le 07.02.2020. Report du clos et couvert au 07.02.2019. Le 07.01.20 l'entreprise confirme une durée de 08 semaines soit un clos et couvert de 08 semaines.	06/11/2019	Fait le 30/04/2020
Organisation pose panneaux de toit : - livraison 02 panneaux par jour x 3 jours = 06 panneaux par semaines soit une durée globale de 08 semaines. La MOEX et AIA demandent une accélération des cadences de livraison et une extension de la présence de l'équipe à 05 jours pour réceptionner les camions. - Fin du clos et couvert projeté au 02.03.20	08/01/2020	Fait le 30/04/2020

Avancement panneaux de Toit 48 unités : - 0% au 18.12.19. Report au 06.01.20 - 04 panneaux posés au 08.01.20 - 06 panneaux posés au 15.01.20 - 12 panneaux posés le 22.01.20 - 18 panneaux posés le 29.01.20 - 24 panneaux posés le 05.02.20 - 40 panneaux posés le 19.02.20 - fin le 02.03.20 Zinguerie et couvertine à réaliser en urgence car entrée d'eau constaté durant la période de confinement. Placo humide vers la cerce centrale.	11/12/2019	Fait le 30/04/2020
La pose des bardages débutera le 20.01.20. AIA précise que la zone sud sera en VRD à partir du 20.01.20. A débuter Urgent. Avancement 0% au 05.02.20. Avancement 65% au 16.11.20	08/01/2020	Fait le 19/06/2020
Travaux Bât C		
Bardage en cours	02/06/2020	En cours À faire pour le 25/06/2020 80%
Commentaire fin de travaux		
Bât A : • Finitions en toiture et en rive jusqu'au 26 juin • Cordon chauffant réalisé. Reste le raccordement à voir avec Electricité Service • Vitrage cassé : faire le point sur la fabrication et la déclaration d'assurance avec Carayon • Pose du bardage des portes pour fin juin si c'est fabriqué • Solder appareillage des Men Ext pour les pré-OPR du 20 juillet Bât B : • Zinguerie en cours. Fin le 26 juin sauf zones mise en attente • Cordon chauffant réalisé. Reste le raccordement à voir avec Electricité Service • Solde du bardage et de la zinguerie à partir du 31 aout pour 10 jours. Date à confirmer mi-juillet selon avancement des Locaux Techniques par autres lots • Bardage sur porte en septembre selon avancement des portes Bât C : • Bardage en cours : environ 80 %. Prochaine livraison le 22.06.20. • Couvertines fabriquée. Pose environ 03 semaines depuis l'extérieur de préférence avec nacelle roue blanche si possible sinon depuis l'intérieur. Début pose le 24 ou 31 aout pour 03 semaines • Bardage sur portes Solatrag à finaliser. Pose en septembre. • Hors échange : pose des châssis de désenfumage et des portes alu à préciser.	16/06/2020	

03 - CABROL - Charpente Métallique - Couverture bac acier :

Etude phase 2		
Aurélien VERTADIER avertadier@cabrol.fr 06.06.72.19.08	20/11/2019	
Travaux Phase 2		
Début montage le 09 mars 20 : livraison en cours depuis le 11.03.20	04/03/2020	Fait le 07/05/2020
Zone à libérer pour les autres lots au 07 mai 2020 soit 04 semaines. Reprise des travaux de charpente le 04.05.20 pour une libération plus 04-05 semaines soit le 06 juin 20	04/03/2020	En cours À faire pour le 07/05/2020 15%

04 - FRIYED et Fils - Cloisons - Doublage - FP :

Etudes cloisons ABC		
sans objet		
Travaux A		
Au 27.11.19 : Retard sur le début des travaux 05 jours. Travaux en cours depuis le 25.11.19	20/11/2019	Fait le 07/02/2020
Travaux B		
Travaux en cours	20/11/2019	En cours 60%
Effectif insuffisant. Renforcer dès lundi 09 mars	04/03/2020	À faire pour le 09/03/2020
Travaux C		
Début des travaux le 16 mars 20. Le 06.05.20, Friyed, précise ne pas avoir l'effectif pour débuter cette zone. AIA à fait plusieurs propositions (ST, intérim, horaire étendue...). L'entreprise regarde.	20/11/2019	En cours 0%

05 - CARAYON - Menuiseries Intérieures :		
Travaux bât A		
Avancement	06/11/2019	En cours 80%
Travaux bât B		
Zone gradins : débuter ossature plafond pour prototype le 05.02.20	16/10/2019	Fait le 21/02/2020
FP zone gradins extrêmement critique. Le respect des délais est impératif. Report de la fin au 13.03.20. Accélérer la cadence. Blocage autres lots. Fin zone FP bois le 13 mars 20	11/03/2020	En cours À faire pour le 13/03/2020 90%
Zone scène en cours. Fin zone scène le 20.03.20	19/02/2020	À faire pour le 28/02/2020
Travaux bât C		
Livraison des huisseries le 11 mai et fixer les huisseries dans le béton	16/10/2019	
06 - TECHNISOL - Parquet :		
Travaux Bât B		
Débuter par barrière étanche et ragréage.	04/03/2020	
Début des travaux le 11 mai 20 pour 03 - 04 semaines. report de 08 semaines suite Covid-19	19/02/2020	
07 - SOLATRAG - Serrurerie - Métallerie :		
Etudes		
Tableau de portes à diffuser	06/11/2019	Fait le 15/11/2019
Etude porte transfo à diffuser.	18/12/2019 Rappel 1	Fait le 07/02/2020
ETUDES B		
Etude porte livraison en cours.	16/10/2019	Fait le 07/02/2020
ETUDES C		
Etude portes à lancer	09/10/2019	En cours 20%
Travaux		
Travaux A		
Reste MC accès R+1		Fait le 28/11/2019
Travaux B et D		
Escaliers à poser et à finir avant fin mars 20. report de 08 semaines suite Covid 19	16/10/2019	À faire pour le 20/12/2019
D : Poser portes	29/04/2020	
Travaux C		
Lancer approvisionnements	09/10/2019	
08 - LIBES - Peinture :		
ETUDES		
M. Gasparian 06 10 84 55 21 BE - gasparian@sopesud-libes.com	04/09/2019	
Travaux Bât A		
Peinture en cours depuis le 17.02.20	19/02/2020	
Finir peinture bâtiment A pour fin mars 20	04/03/2020	
Travaux Bât B		
Travaux sur ouvrage béton scène depuis le 17.02.20	19/02/2020	
09 - CHUECOS - Sols Souples :		
ETUDES B et C		
Diffuser le 02 mai en réunion de chantier : - plan de repérage - FT étanchéité, ragréage - FT et nuancier lino - FT nez de marche	24/04/2019	Fait le 28/06/2019
Travaux Bât B		
Etape 01 : résine + ragréage fin mars + 08 semaines suite Covid 19 Etape 02 : pose des sols à suivre	08/01/2020	

10 - REINAUDO - Carrelage - Faïence :		
ETUDES ABC		
Fournir cadre paillasson au maçon pour fin décembre	26/06/2019	À faire pour le 02/07/2019
Travaux Bât A		
Sanitaires : fin carrelage le 24.01 Faïences sanitaires à partir du 27.01	20/11/2019	Fait le 30/04/2020
Travaux Bât B		
Début carrelage à partir du 24 février. Fin programmé pour fin mai 2020	19/02/2020	En cours 40%
11 - THERMATIC - Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie :		
ETUDES		
- Schémas armoires électriques sous-station diffusés en novembre - Dossier étude acoustique (en cours chez sous-traitant – Bureau Veritas Solution) pour le 25.10.2019. Principe envoyé. Sujet des GF et des gabions à étudier avec MOEx. Echange en cours en novembre 2019	04/09/2019	
- Dossier GTC : principe pour le 11.10.2019 diffusé. Suite à la réunion du 10 décembre 2019, le département doit transmettre des éléments pour permettre la diffusion de l'analyse fonctionnel avant fin janvier 2020	23/10/2019	
Bât ABC		
A : 100%	02/05/2019	Fait le 04/10/2019
B: Etudes : 95%	02/05/2019	Fait le 27/09/2019
C : Etudes : 95%	24/04/2019	Fait le 04/10/2019
D : Sujet acoustique, prises d'aire et gabions à finaliser avec MOE	18/09/2019	Fait le 27/09/2019
Travaux		
Bât A		
Travaux PB en cours. Gaine à suivre.		
Bât B		
Début des incorporations le 13.01.20	08/01/2020	En cours 70%
Distribution Rdc en cours depuis fin janvier 20	19/02/2020	
12 - ELECTRICITE SERVICE - Electricité :		
ETUDES		
Etude à solder URGENT	04/09/2019	
Bât AB et D		
Exe A : 100% yc DT	02/10/2019	Fait le 04/10/2019
Exe B : 100% sauf DT environ 90%	02/05/2019	Fait le 06/12/2019
Bât D : Plan de principe du transfo envoyé à Enedis. Réponse Enedis à exiger	02/10/2019	Fait le 21/02/2020
Bat C		
Exe C : DT, plan exe pour le vendredi 18.10.2019. NON DIFFUSE - RETARD. Diffusion confirmé pour le 15.11.19 puis a fin novembre 2019. Nouveau report à janvier 2020. Diffusé début janvier 20 sauf armoires	25/09/2019	Fait le 07/02/2020
TRAVAUX Bât A		
Distribution en cours	04/09/2019	En cours 80%
TRAVAUX Bât B		
Début des incorporations le 13.01.20 Distribution en cours	08/01/2020	En cours 60%
13 - KONE - Ascenseur :		
ETUDES Bât C		
Plateforme : plan de principe selon CCTP envoyé. Relancer BC pour avis	04/09/2019	
Travaux		
Début travaux le 23.03.20. report au 25 mai 20	19/02/2020	

14 - BC CAIRE - Machinerie scénique :		
Travaux A		
Sans objet		
Travaux B		
Début passerelle le 16 mars 20	19/02/2020	
Début gril-faux gril fin mars	11/03/2020	

15 - COS - Gradins télescopique :		
Etudes		
Envoyer puissance électrique et position de l'attente avant fin mai	24/04/2019	Fait le 28/06/2019
Fabrication 08 à 10 semaines à partir du 02 septembre 2019 (tribunes et fauteuils)	24/04/2019	Fait le 21/02/2020
Travaux B		
Faire réception de support GO	08/01/2020	
Travaux en juin 20	19/02/2020	
Travaux C		
Sièges amphi : envoyer échantillons pour le 17.01.20 base marché et variante Fabrication 12s et 04s si couleur non standard	08/01/2020	
Numérotation à finaliser	08/01/2020	

16 - TEXEN - Réseaux scéniques :		
TRAVAUX		
Bât A		
Finir distribution et débuter appareillage	04/03/2020	
Bat B		
Débuter distribution et aménagement des Locaux techniques	04/03/2020	

17 - COLAS - V.R.D. :		
Travaux ABD		
Phase 1: Début des travaux reporté au 17 janvier 2020	19/06/2019	Fait le 23/08/2019
Travaux en cours	04/03/2020	En cours 80%
Sud : enrobés jeudi 26 mars	11/03/2020	
Nord: réalisation grave pour fin mars	11/03/2020	
Travaux Phase 2 - Bât C		
Phase 2 : début VRD semaine 16 ou semaine 17 (lundi 20 avril)	11/03/2020	

18 - PSP - Espaces Verts :		
Travaux Phase 1 - ABD		
Fosses d'arbres : en mars 20 + arrosage	26/06/2019	
Travaux Phase 2 - C		
Travaux à débuter selon planning	26/06/2019	

100 - THERMASUD - Equipement Cuisine :		
ETUDES Bât A - Cuisine et Bar		
Siphons-caniveaux et chambre froide : - Implantations - Réservations	02/05/2019	Fait le 12/07/2019
Dossier technique - FT appareillages pour le 17 mai - Implantations pour le 07 mai 2019. Attention sujet du bar à régler en urgence	02/05/2019	Fait le 12/07/2019
Electricité: - bilan de puissance de l'ensemble du lot : pour le 17 mai - position des prises et des attentes pour le 07 mai	02/05/2019	Fait le 12/07/2019
Hotte : synthèse du LT à finaliser avec BE - FT - FT extracteur - Réservation en dalle haute du Rdc (avant fin mai) - Maquettage du local	02/05/2019	Fait le 27/09/2019
Split : synthèse du LT à finaliser avec BE - FT - Positions - Cheminement réseaux	02/05/2019	Fait le 12/07/2019
Bar : - implantations des équipements à finaliser en urgence	10/07/2019	Fait

Travaux A		
Travaux en cours dans les LT	22/01/2020	

9 - ANNEXES	CRÉÉE LE	STATUT
Pièces jointes au CR		
Planning exe en cours indice du 17 janvier 20		

Diffusion	Visite	Rédacteurs	Date : 21 août 2020
Mme Avril - Mou	Du 17 août au 21 août 2020	Noëmie Cano et Philippe HALADJIAN	

Classement	Projet		
	Construction d'une salle de spectacle	Domaine de Bayssan - Béziers	

CR simplifié du vendredi 21 août 2020

	N°	Lot	Entreprise	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	Tâche en cours
	1	GO - Terrassement	SOGEA	5	5	4	5	5	Les finitions gros œuvre bâtiments C sont en cours. (notamment au niveau de la fosse)
	01A	Etanchéité	SOGEA	0	0	0	0	0	La barrière étanche au sol des locaux techniques Nord et Sud du bâtiment B ainsi que celle de la zone ascenseur gradins bâtiment C et de la fosse bâtiment C sont terminées. Reprise de l'étanchéité à prévoir dans les locaux techniques bâtiment B.
	2	Charpente/Bardage/Couverture/ Menuiseries ext.	PYRENEES CHARPENTE	0	0	0	0	0	Les bardages des bâtiments sont terminés, reprise en septembre.
	3	Charpente métallique/Couverture bac acier	CABROL	4	4	0	0	0	Pose des bacs et de l'étanchéité bâtiment C. Attention à l'effectif. Dépose des filets à venir.
	4	Cloisons/Doublage/FP	FRIYED et Fils	0	0	0	0	0	
	5	Menuiseries intérieures	CARAYON	0	0	0	0	0	
	6	Parquet	TECHNISOL	5	5	4	3	4	Pose du parquet côté gradins bâtiment B en cours.
	7	Serrurerie/Métallerie	SOLATRAG	0	0	0	0	0	Reprise des travaux la semaine prochaine.
	8	Peinture	LIBES	0	0	0	0	2	Reprise des travaux bâtiment C.
	9	Sols souples	CHUECOS	0	0	0	0	0	Reprise des travaux en septembre bâtiment C.
	10	Carrelage/Faïence	REINAUDO	0	0	0	0	0	
	11	Chauffage/Ventilation/ Climatisation/ Plomberie	THERMATIC	5	5	5	6	0	Distribution en cours au niveau des sanitaires et des loges bâtiment C, ainsi que dans les loges bâtiment B. Aménagement du local technique Nord bâtiment B (pose des gaines) terminé. Aménagement du local technique Sud bâtiment B entamé depuis le 03/08. Aménagement de la zone Ouest du bâtiment C en cours.
	12	Electricité	ELECTRICITE SERVICE	4	3	3	3	3	Distribution en cours bâtiment C. Pose des luminaires bâtiment A terminée.
	13	Ascenseur	KONE	0	0	0	0	0	Installation de l'ascenseur bâtiment C terminée.
	14	Machinerie scénique	BC CAIRE	7	7	7	7	7	Appareillage passerelle R+2 bâtiment B en cours, distribution local machinerie en cours et installation de la scène levante bâtiment C en cours.
	15	Gradins télescopiques	COS	0	0	0	0	0	Début de la pose des gradins bâtiment B prévue à partir du 26 août. Coordination à prévoir avec TECHNISOL et leurs ponçeurs.
	16	Réseaux sceniques	TEXEN	3	3	0	0	0	En cours : appareillage du bâtiment B. Appareillage de la zone gradins télescopiques bâtiment B en cours. Attention aux effectifs.
	17	VRD	COLAS	10	11	12	10	10	Pose du marbre en cours sur tous les extérieurs. Béton désactivité en cours phase 2.
	19	Espaces verts	PSP	0	0	0	0	0	
	100	Equipements cuisine	THERMASUD	0	0	0	0	0	

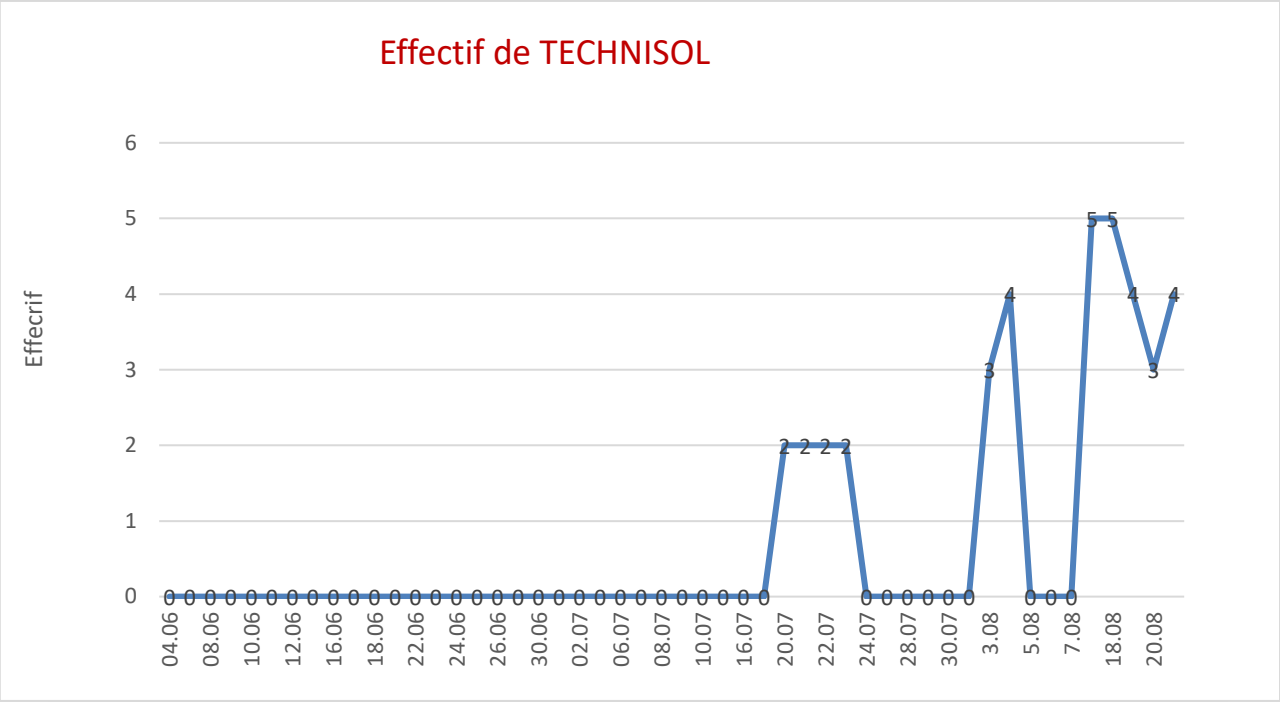
Effectif de TECHNISOL
Effecrif
6
5
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

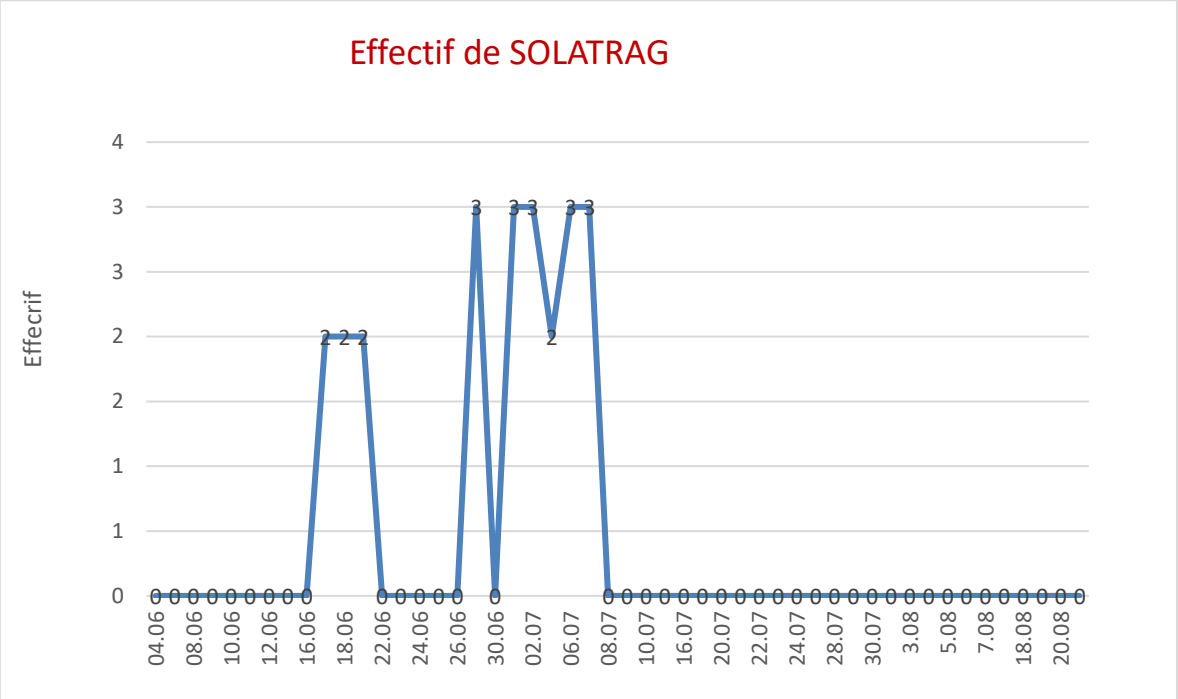
Effectif de SOLATRAG
Effecrif
4
3
3
2
2
1
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

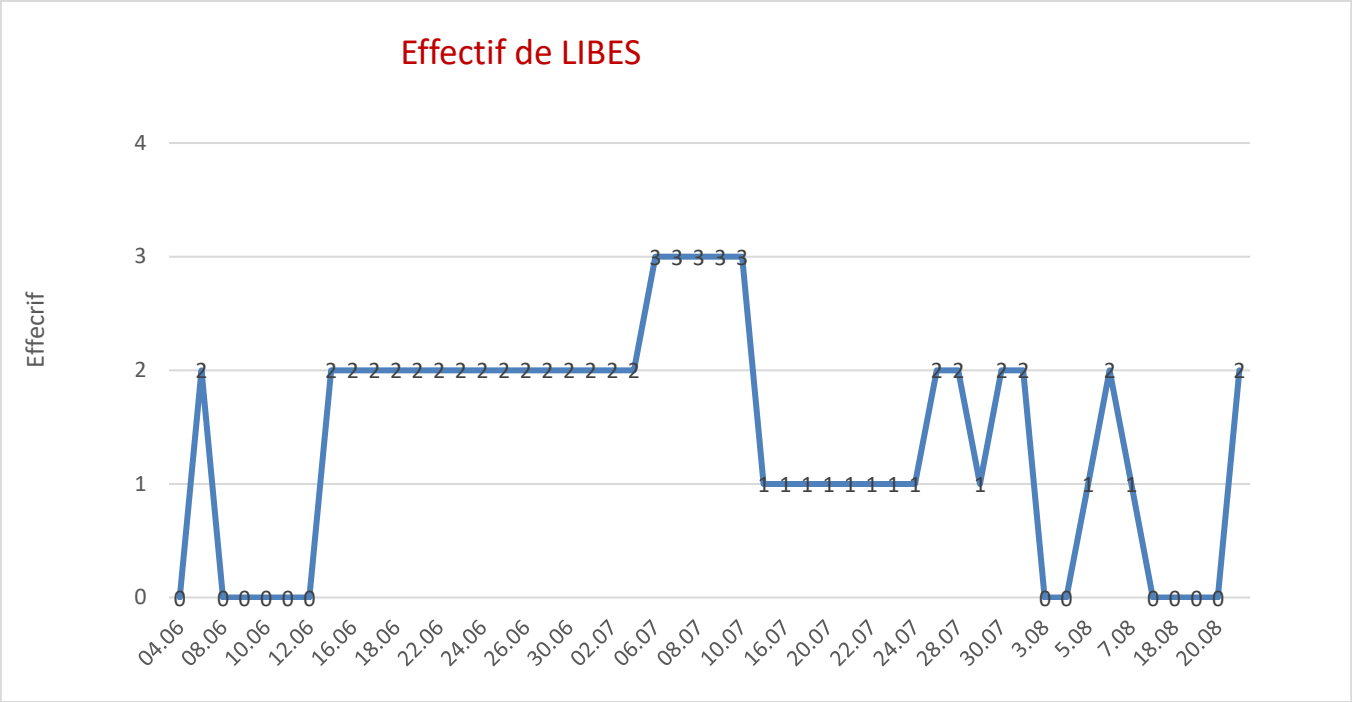
Effectif de LIBES
Effecrif
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

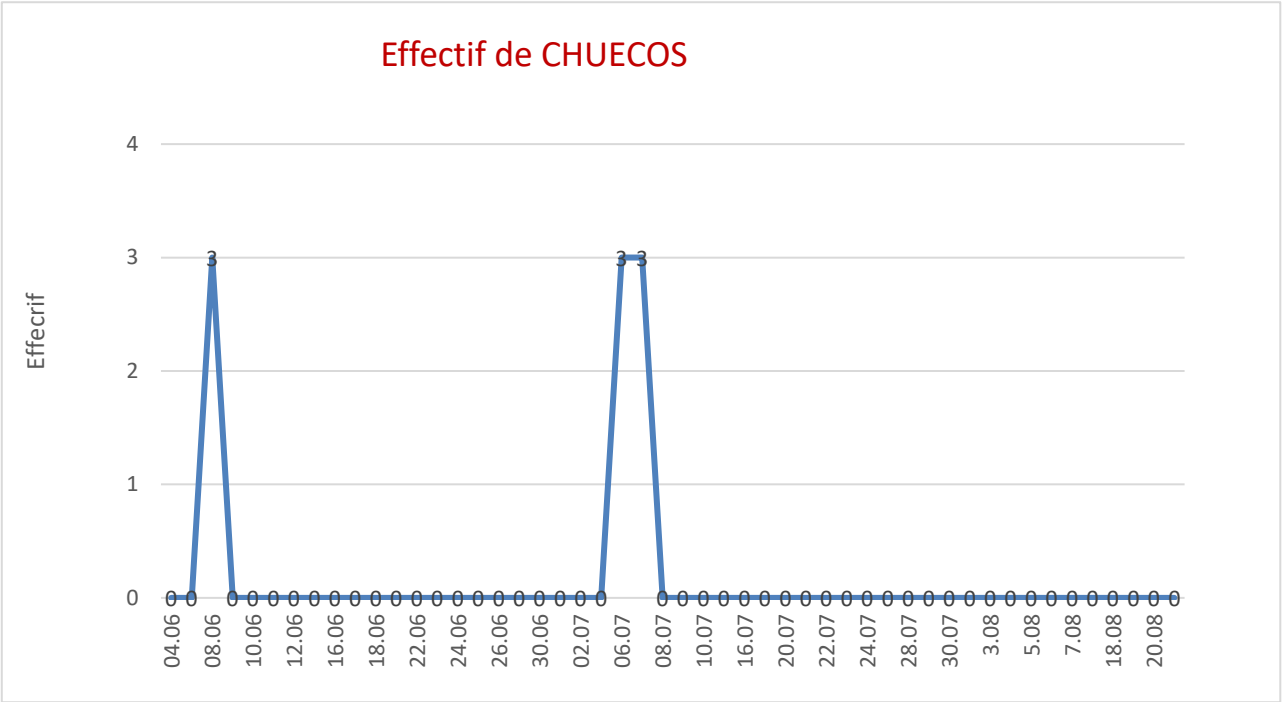
Effectif de CHUECOS
Effecrif
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

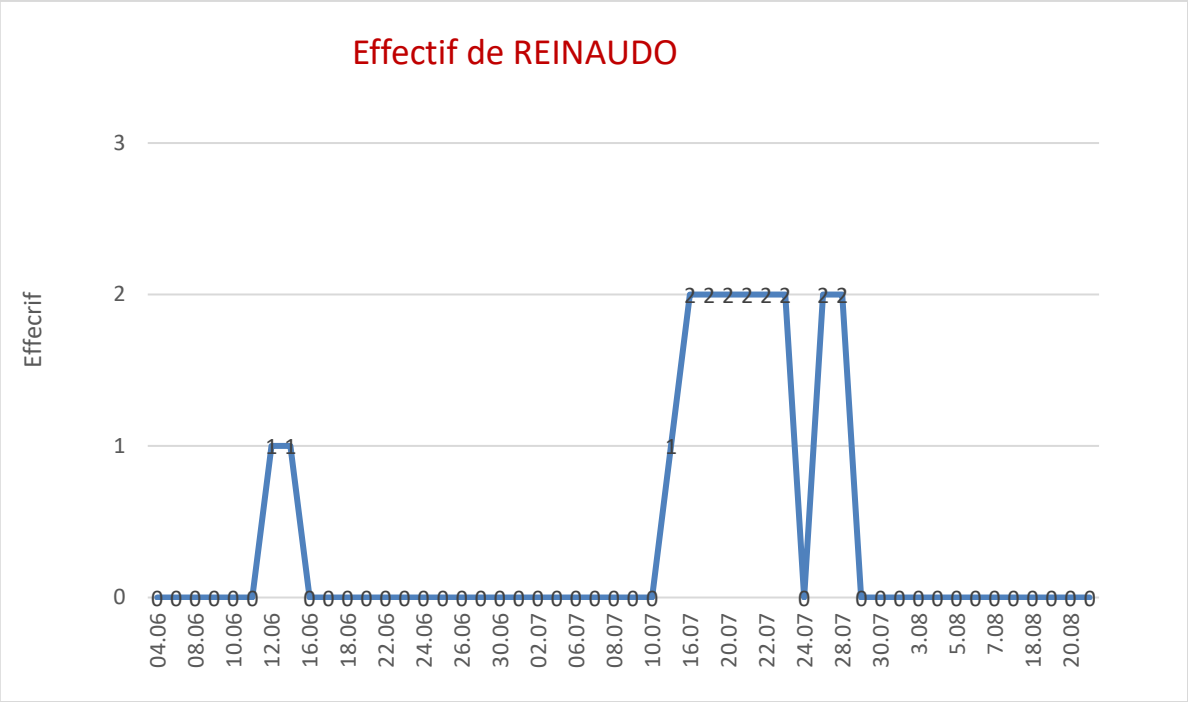
Effectif de REINAUDO
Effecrif
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

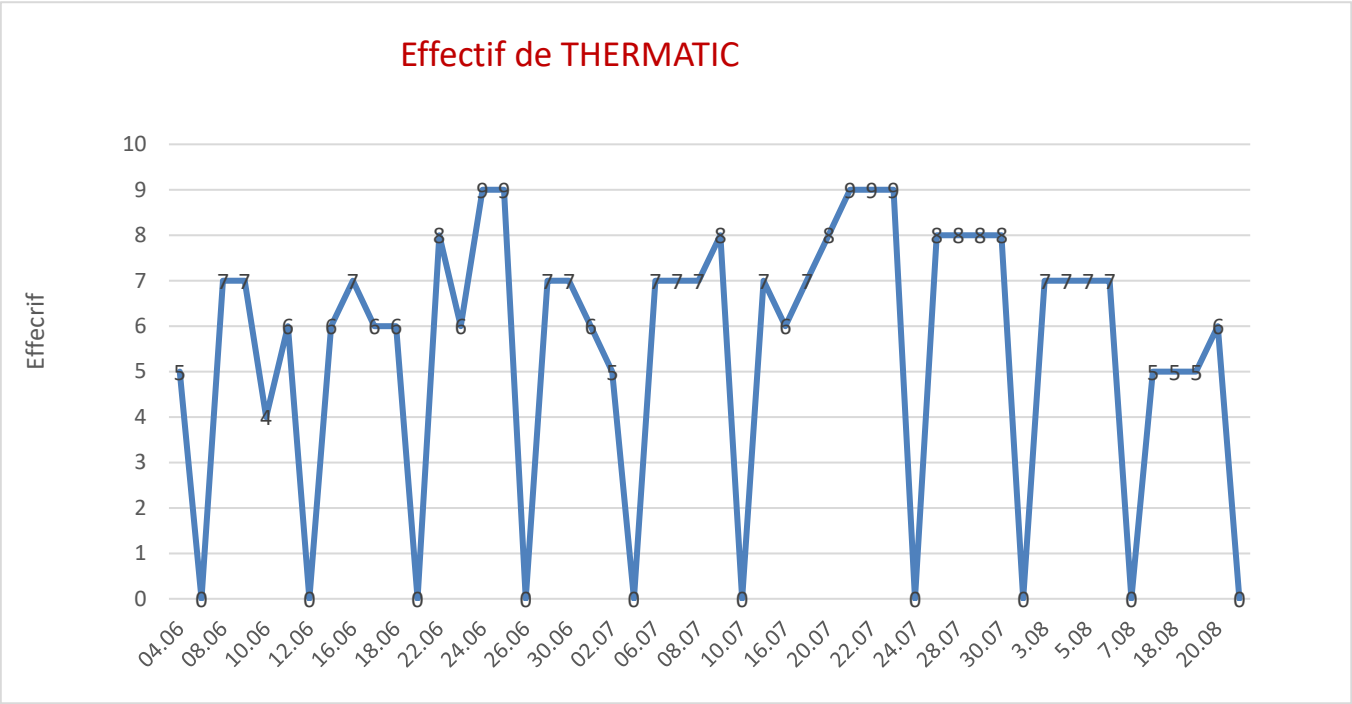
Effectif de THERMATIC
Effecrif
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

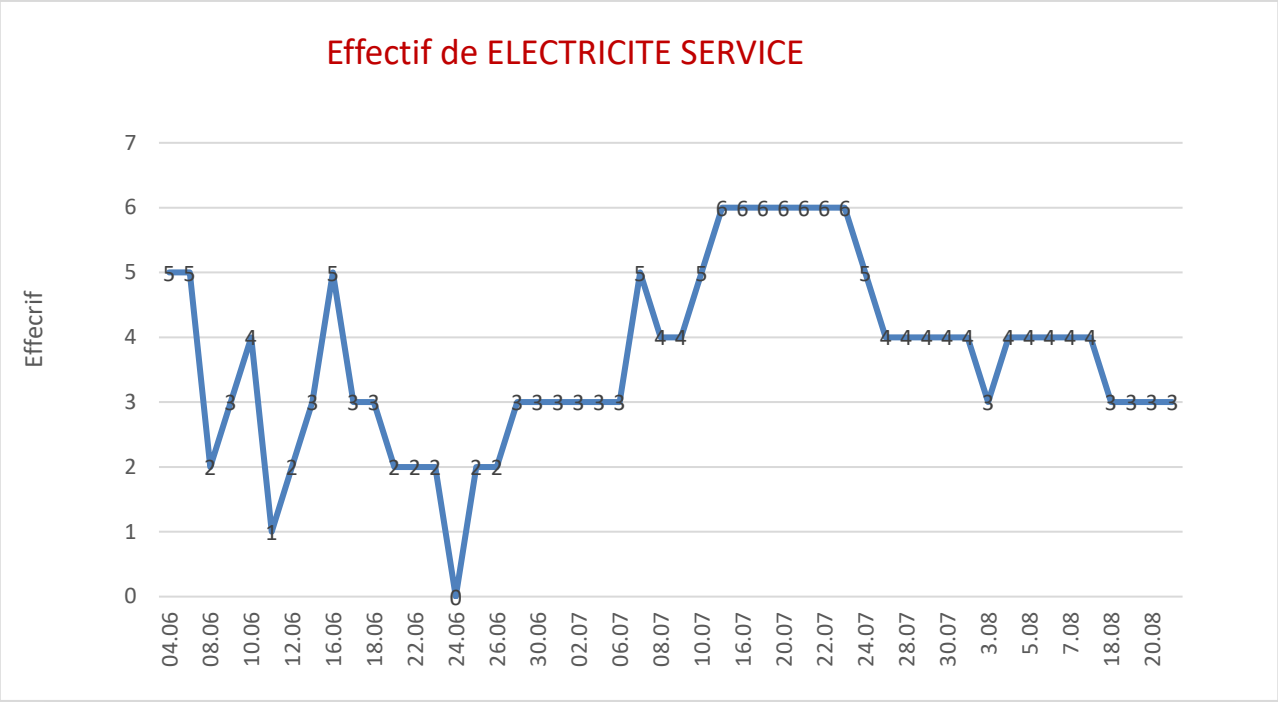
Effectif de ELECTRICITE SERVICE
Effecrif
0
1
2
3
4
5
6
7
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

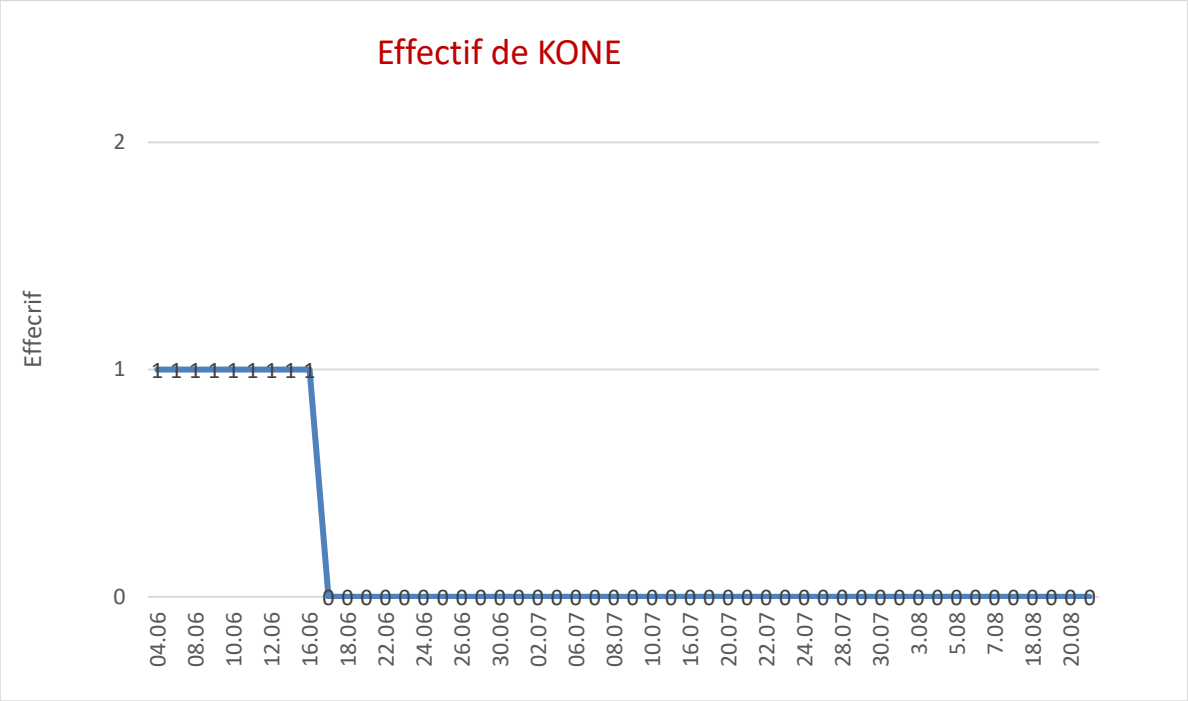
Effectif de KONE
Effecrif
0
1
2
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

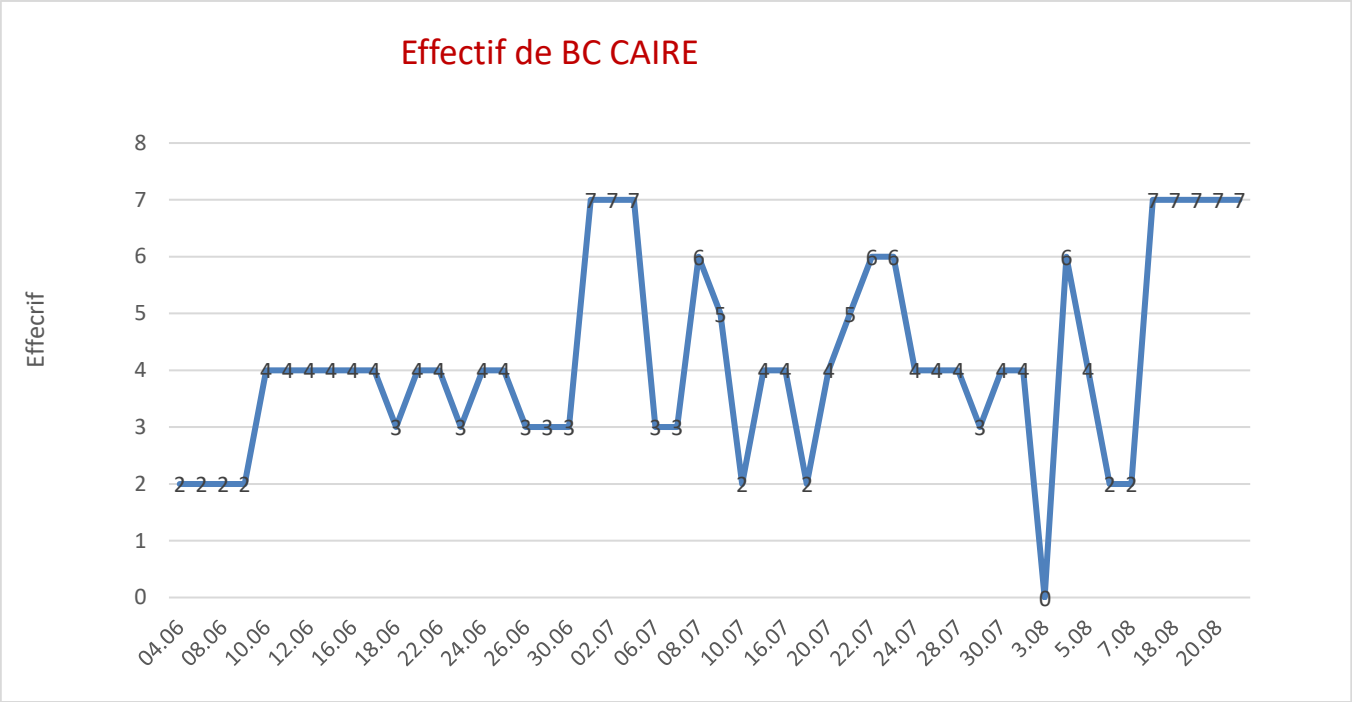
Effectif de BC CAIRE
Effecrif
0
1
2
3
4
5
6
7
8
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

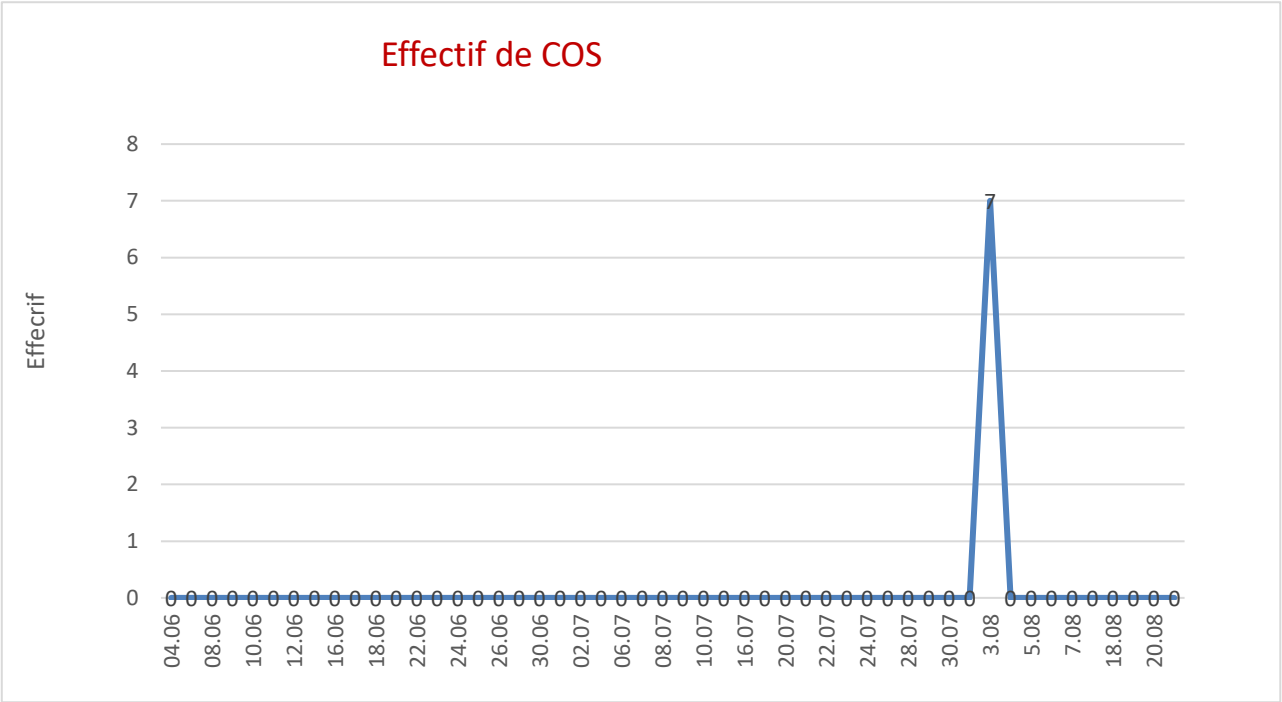
Effectif de COS
Effecrif
0
1
2
3
4
5
6
7
8
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

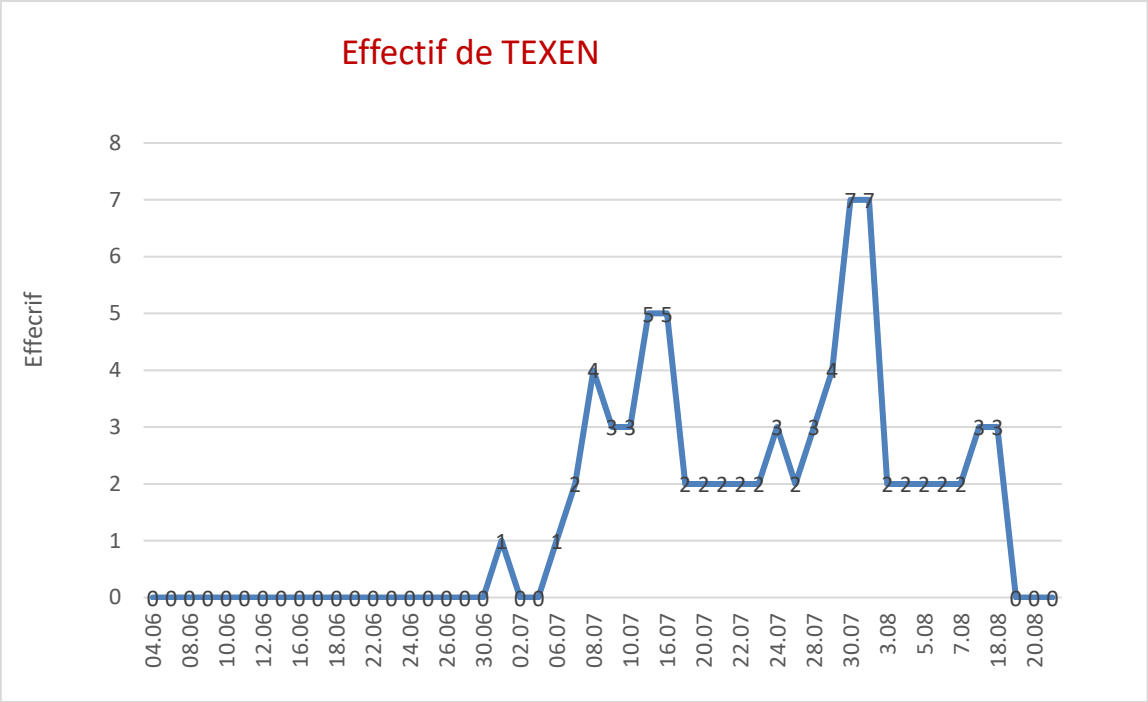
Effectif de TEXEN
Effecrif
0
1
2
3
4
5
6
7
8
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

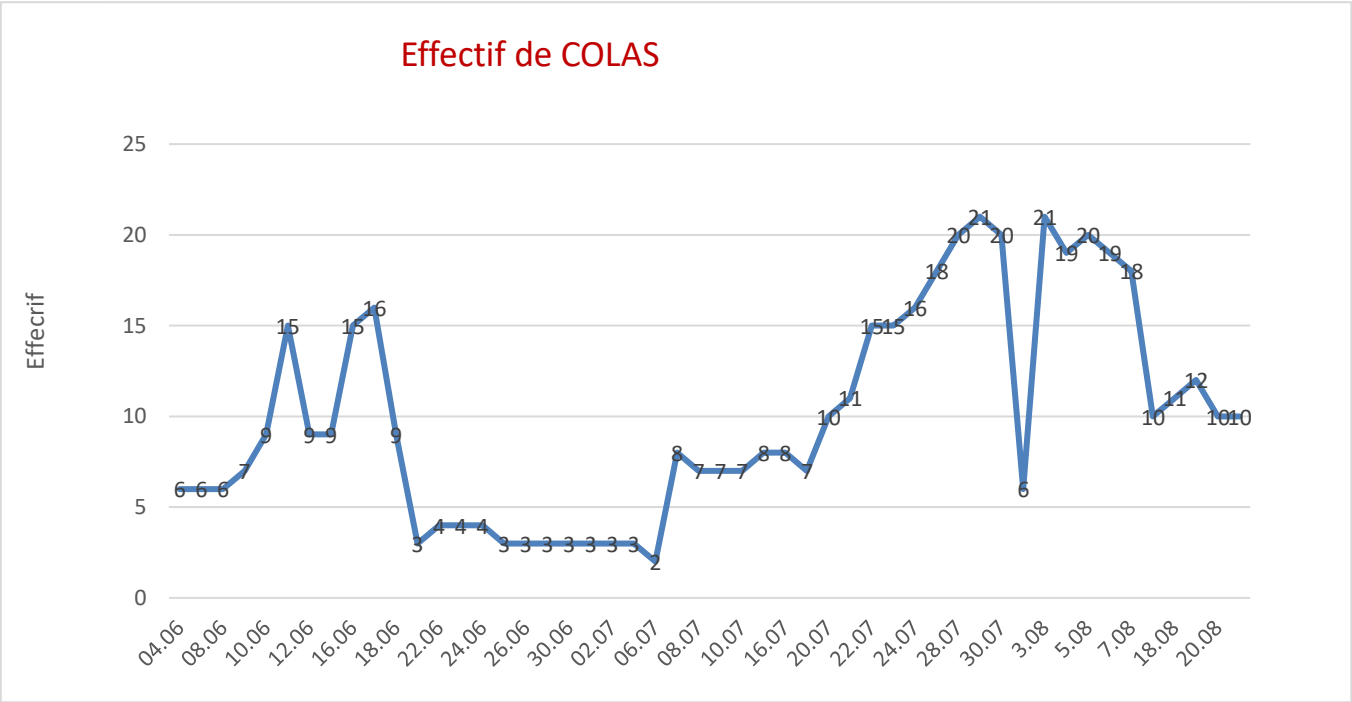
Effectif de COLAS
Effecrif
0
5
10
15
20
25
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

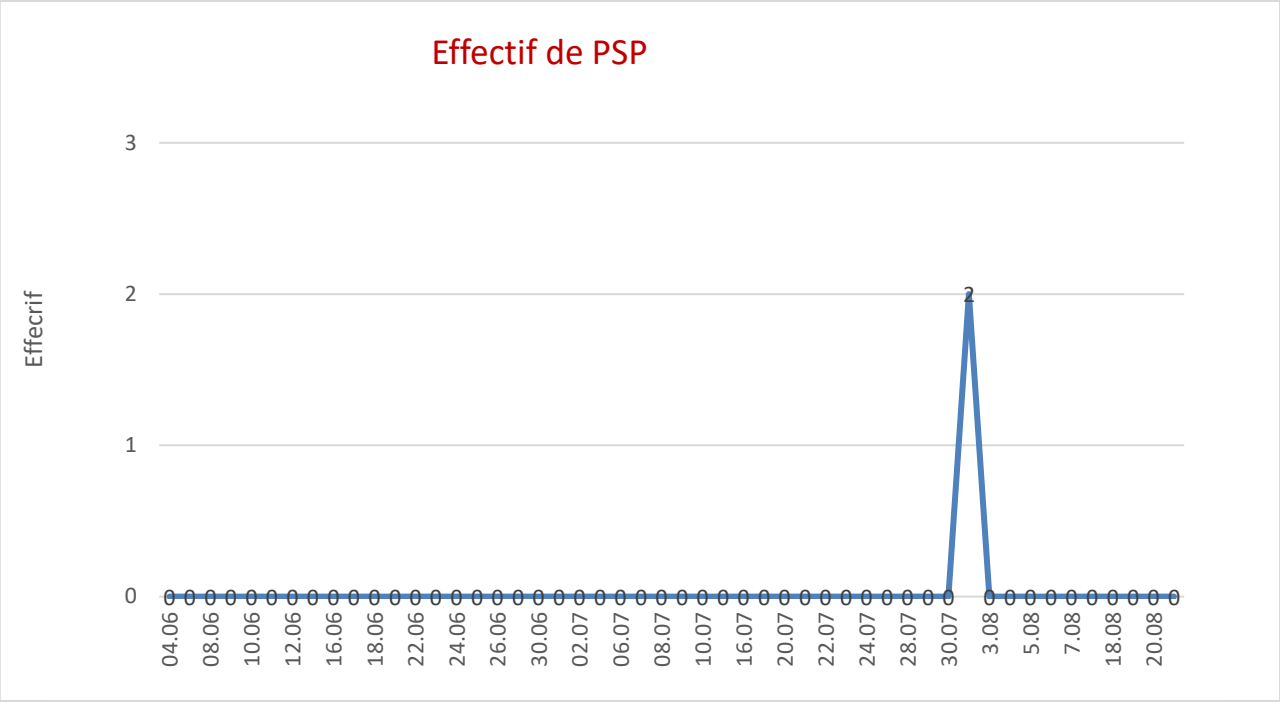
Effectif de PSP
Effecrif
3
2
1
0
2
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

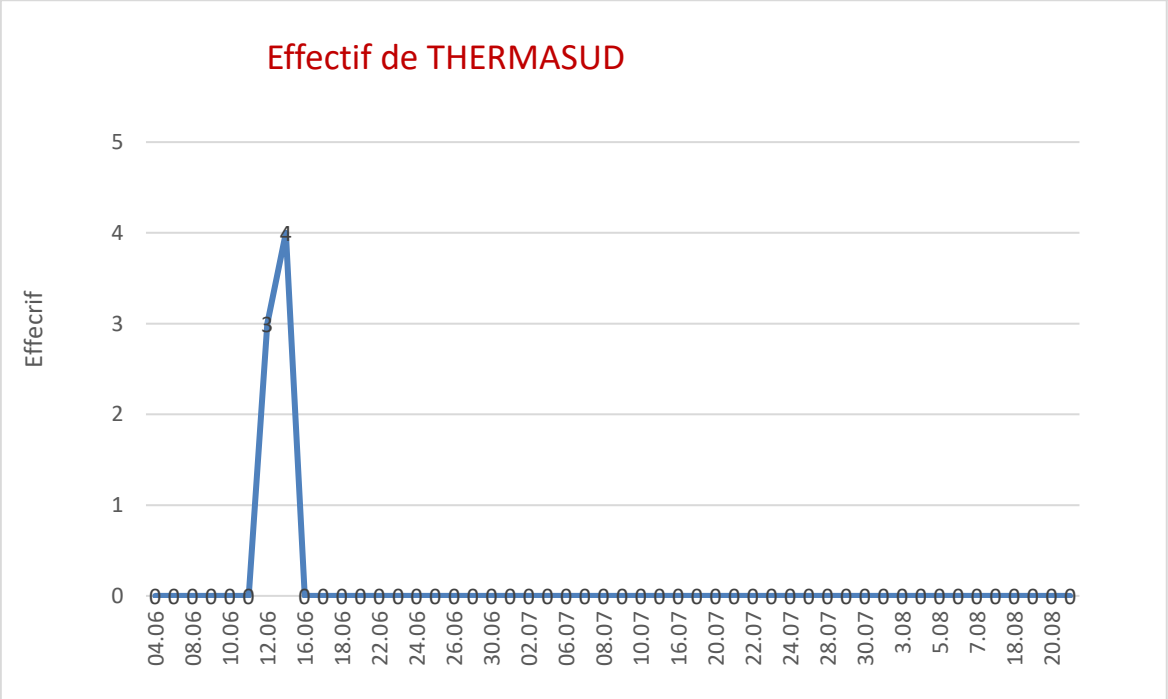
Effectif de THERMASUD
Effecrif
5
4
3
2
1
0
3
4
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

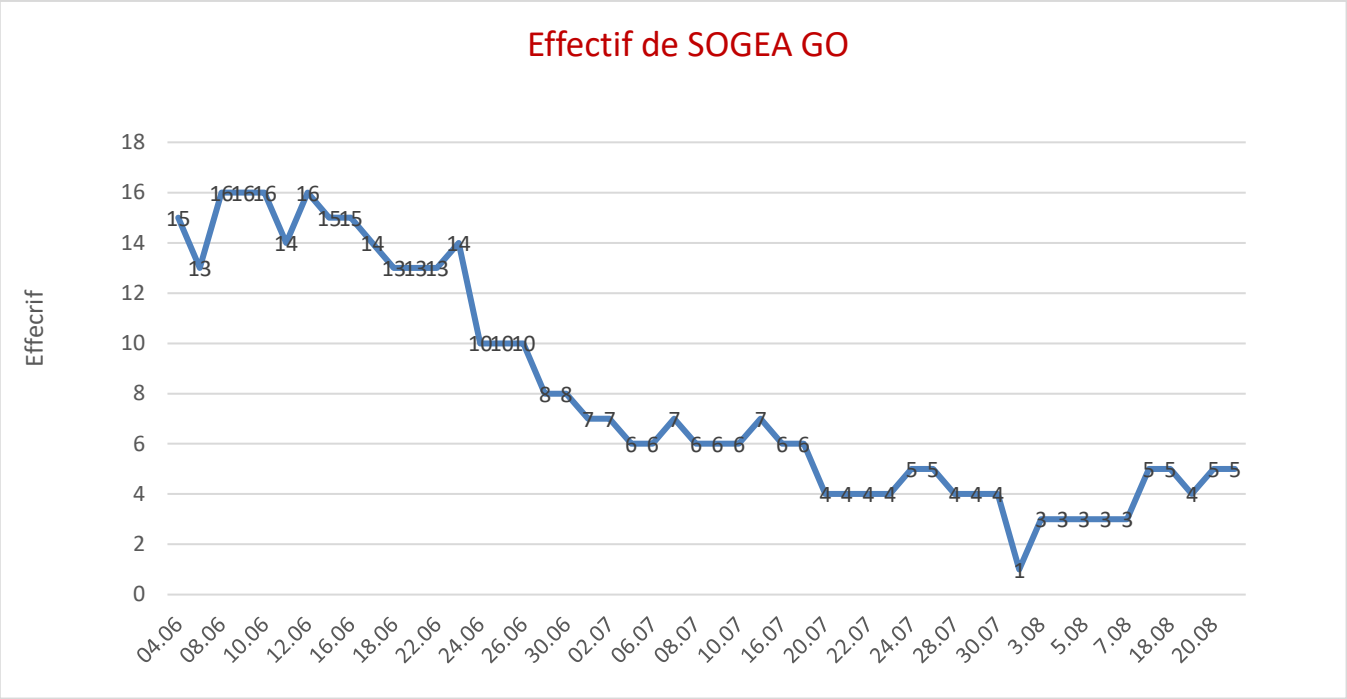
Effectif de SOGEA GO
Effecrif
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

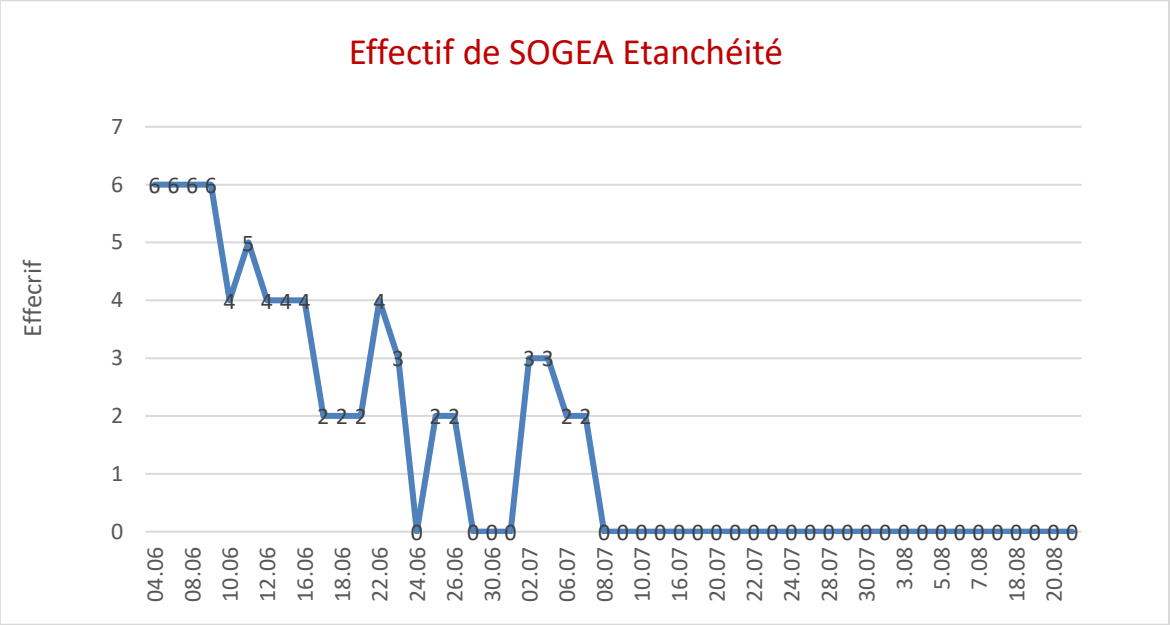
Effectif de SOGEA Etanchéité
Effecrif
7
6
5
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

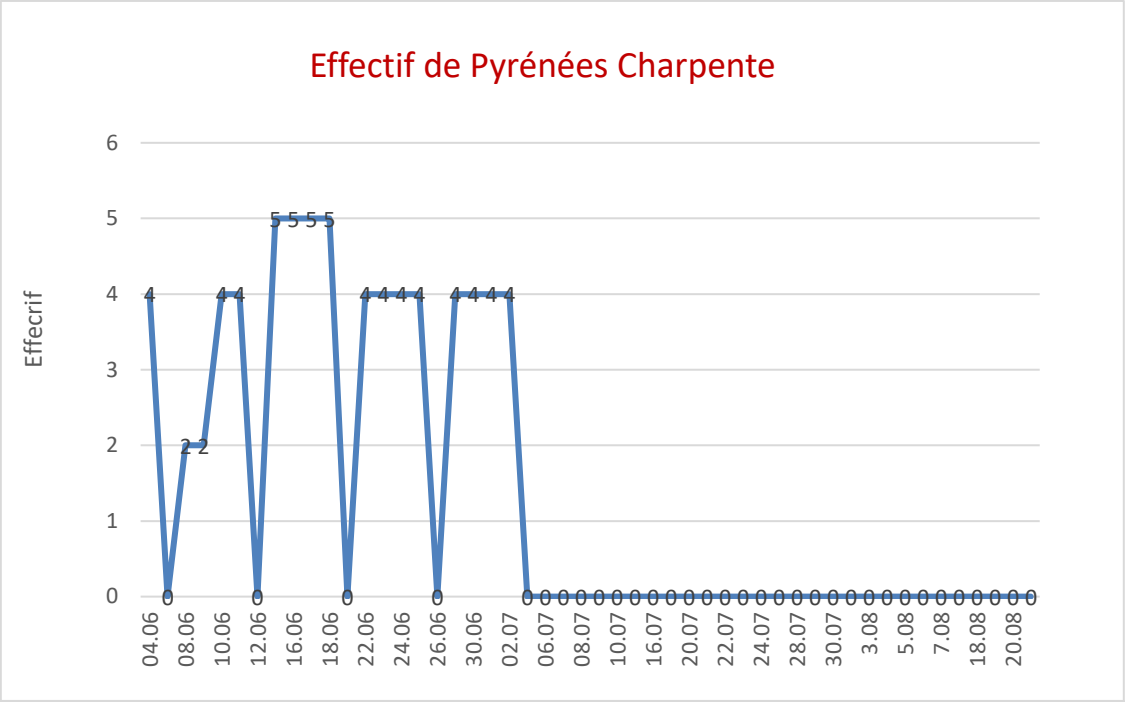
Effectif de Pyrénées Charpente
Effecrif
6
5
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

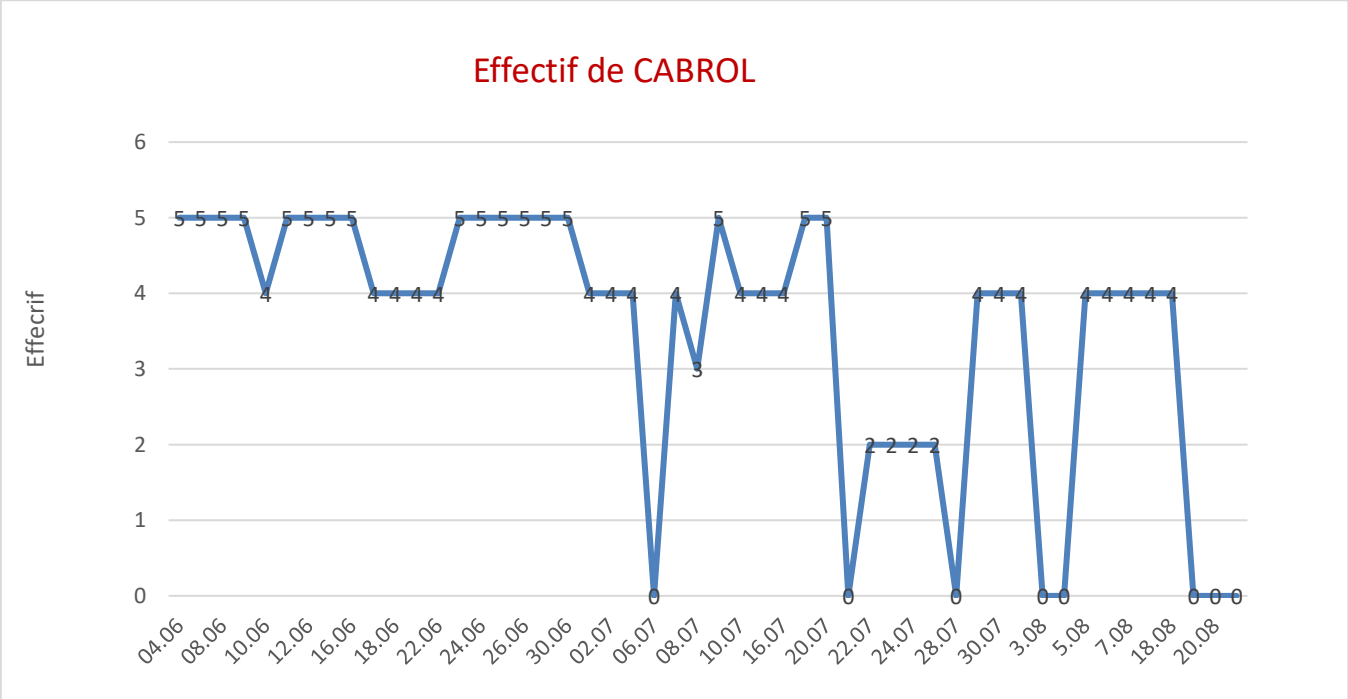
Effectif de CABROL
Effecrif
6
5
4
3
2
1
0
04.06
08.06
10.06
12.06
16.06
18.06
22.06
24.06
26.06
30.06
02.07
06.07
08.07
10.07
16.07
20.07
22.07
24.07
28.07
30.07
3.08
5.08
7.08
18.08
20.08

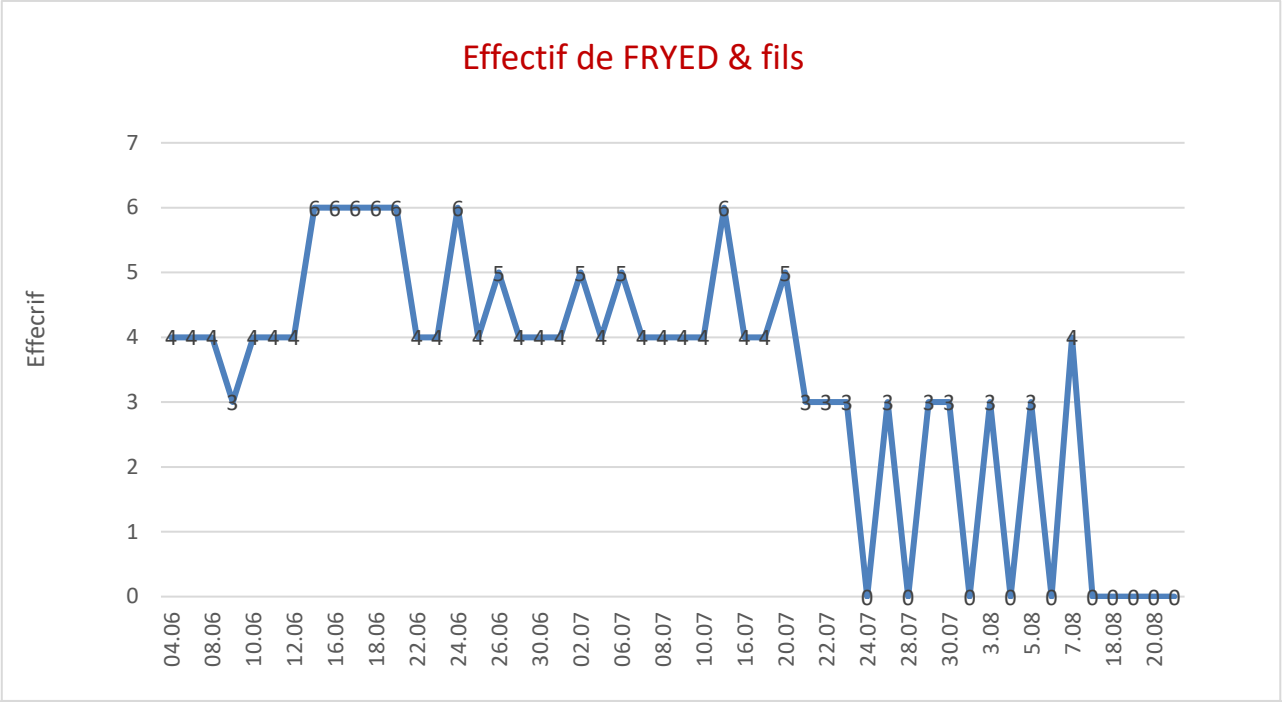

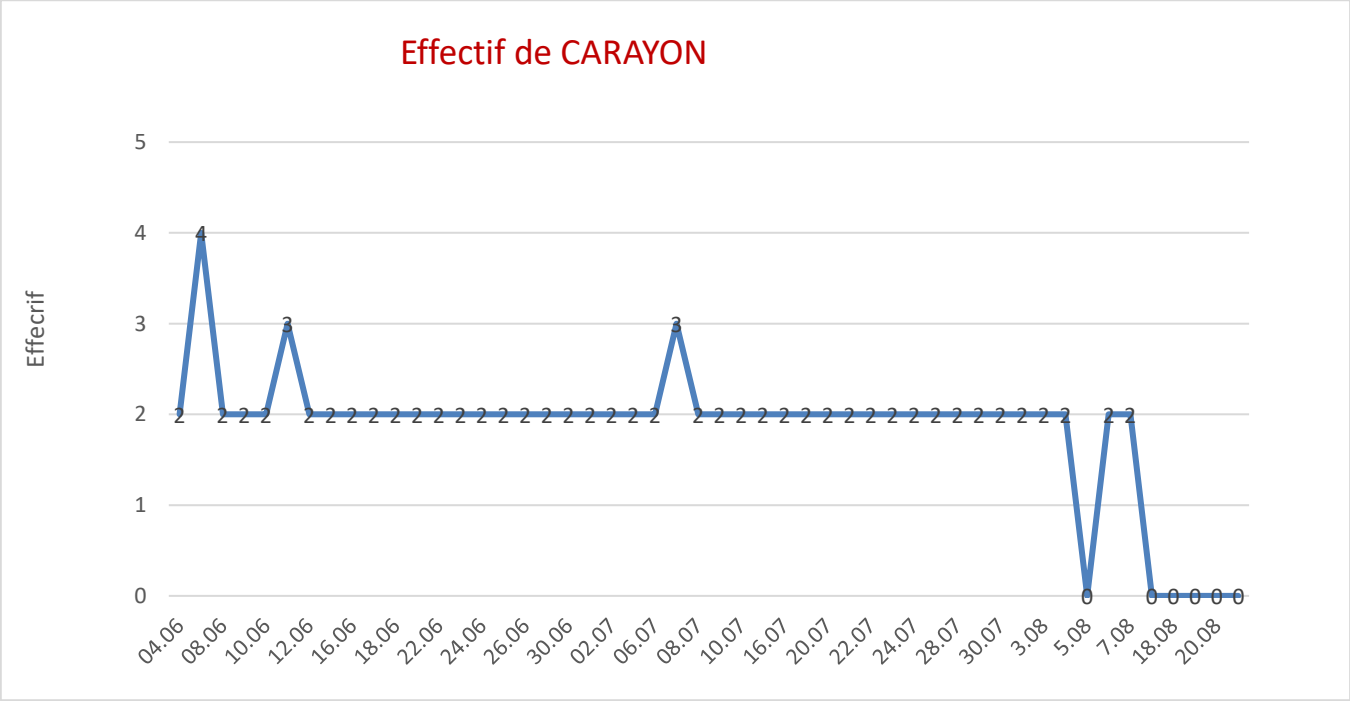

Quelques dates jalons :

Bât A :

- Pré-OPR S30 (20-25 juillet 2020)

Bât B :

- Début machinerie BC Caire le 22 juin
- Début Texen le 06 juillet
- Début parquet scène le 13 juillet
- Début parquet gradin le 20 juillet
- Début plancher télescopique le 07 septembre

- Courant depuis TGBT le 07 septembre pour essais

Extérieurs phase 1 :

- Début pierre le 10 juin 2020

Bât C :

- Fin gradins : fin juin
- Début plaquiste : le 15 juin, nouveau report au 22 juin (effectif insuffisant)
- Début bacs sur charpente métallique le 06 juillet
- Début BC Caire le 20 juillet
- Début proscénium le 10 aout

Extérieurs phase 2 :

- Début VRD nord : 29 juin
- Début pierre : fin juillet

Livraison Phase 1 : fin octobre 2020
Livraison Phase 2 : fin novembre 2020

AGENCE
20 rue Lortet 69007 Lyon / T. +33 4 78 33 46 77 / F. +33 4 78 33 51 50
aia.management.lyon@a-i-a.fr / www.a-i-a.fr/management

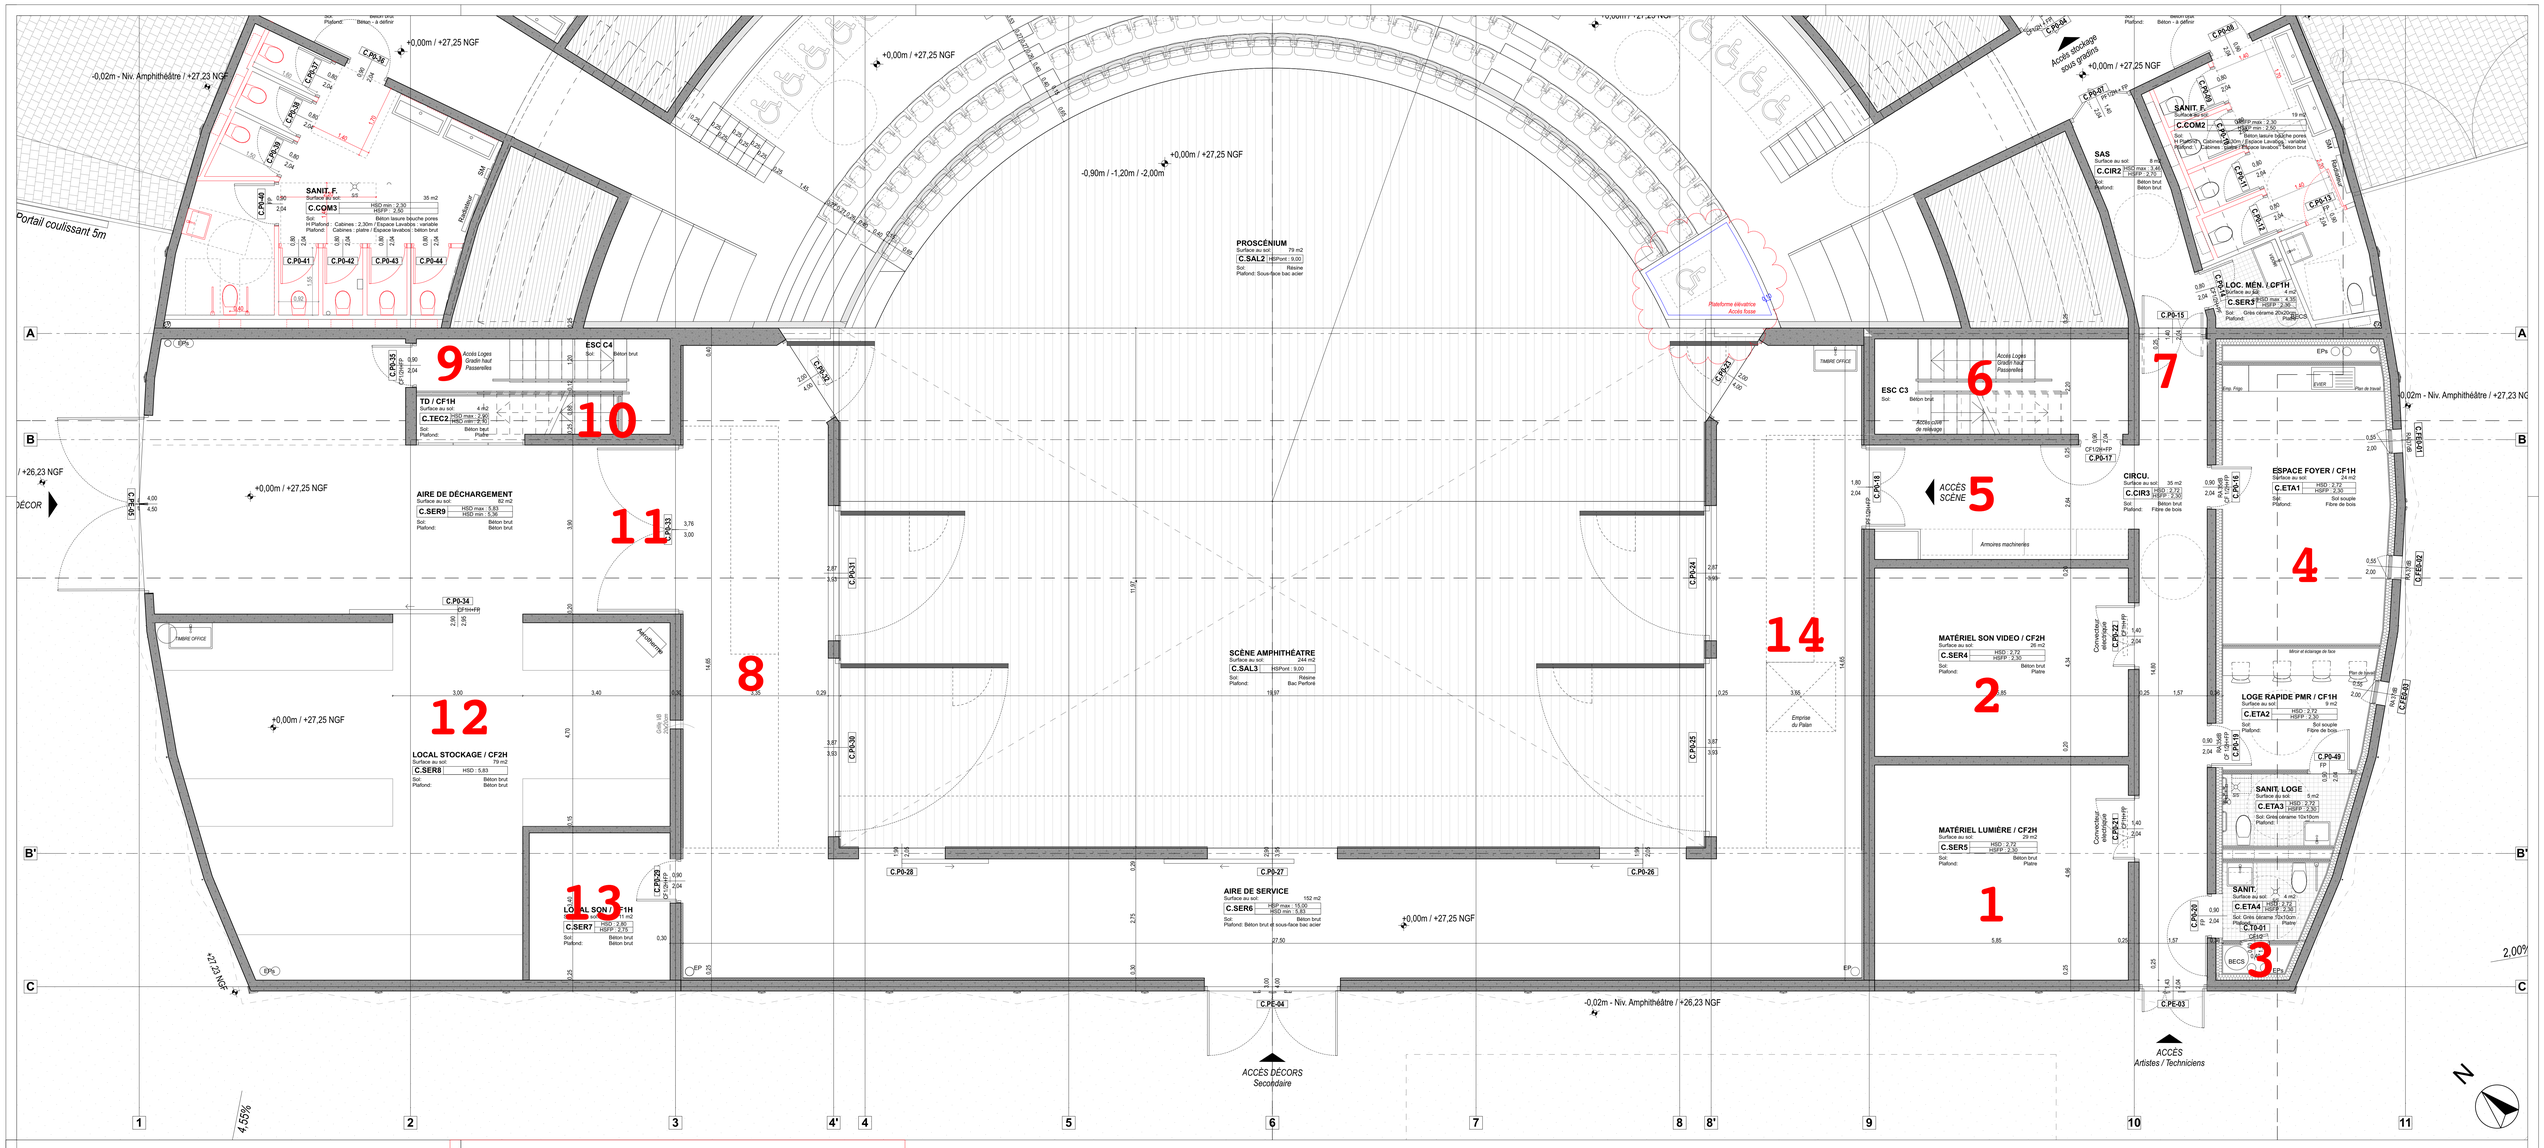

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPECTACLE ET D'UN AMPHITHÉÂTRE DE PLEIN AIR AU DOMAINE DE BAYSSAN

MAITRISE D'OUVRAGE

Département Hérault
Hôtel du département - Mas d'Alco
1977 Avenue des Moulins
34087 MONTPELLIER

Chargés d'opération :
- Hélène AVRIL
tél: 04.67.67.67.17
havril@herault.fr

DEKRA (Bureau de contrôle)
725 rue Louis Lépine
34000 MONTPELLIER

Chargé d'opération
- Guillaume MARTINEZ
tél: 04.67.22.04.88

MAITRISE D'OEUVRE

K-architectures (Architectes mandataires)
9 rue de la Pierre Levée
75 011 PARIS
tel/01 53 26 36 45

Architecte :
Karine Herman

Chef de projet :
Thomas Ehrhardt
k.thomasehrhardt@gmail.com

K ARCHITECTURES
SIGWALT
HERMAN

BATISERF Ingénierie, BET structure
agence@batiserf.com - 04.76.24.83.60

CHANGEMENT À VUE, scénographes
atelier@cav-aviano.com - 01.47.00.21.40

BMF, économiste
bureau@bmf-conseil.fr - 04.76.65.19.34

CHOULET, BET fluides + SSI + HQE
administration@betchoulet.fr - 04.73.28.60.50

ALTIA, BET acoustique
altia@altia-acoustique.com - 01.53.00.90.65

Atelier VOLGA, paysagistes
contact@atelievolga.com - 09.53.12.47.25

ATEVE, BET VRD
contact@ateve.fr - 01.48.80.86.58

AIA MANAGEMENT, OPC
aia.management.lyon@aia-a.fr- 02.40.94.79.50

PLAN RDC (2) / 1:50°

CODE PROJET	PHASE	INDICE	DATE D'EDITION	PLANCHE
BAY	DET	06	04/06/2020	C_02.1

INDICE 06 - 19/06/20
LISTE DES MODIFICATIONS

MODIFICATIONS BATIMENT C - AMPHITHÉÂTRE

- Déplacements mineurs des cloisons dans les sanitaires C.COM 1/2/3/4 y compris équipements plomberie sanitaires

- Déplacement du nu de pose de la porte C.P1-02

- Déplacement d'une cloison dans la loge 2 (C.ETA8)

1
- Finitions gros œuvre
- Blocage FP à réaliser : poser chemins de câbles, distribution THERMATIC et boucher réservations élec

2
- Nettoyage
- Distribution électrique
- Distribution THERMATIC

3
- boucher réservation qui donne sur l'extérieur
- FRIYED : cloisons
- THERMATIC : distribution

4
- FRIYED : cloisons

5
- Sac de ciment à verser pour bloquer les EP

6
- Finitions GO

7
- CARAYON : portes manquantes

8
- Marcage à la bombe des trous à garder/reboucher

9
- Déposer les étaies
- Poser le cadre de la porte en bois

10
- Friyed : cloisons à bâtir

11
- Sac de ciment : EP

12
- Finitions GO

13
- Finitions GO + gaine gênante au niveau de la porte

14
- Finitions GO
